



**WELCOME &
NAMASTE**




**Annual Review Workshop
Fiscal Year : 2078/79**

Rangeli Municipality



रंगेली नगरपालिका

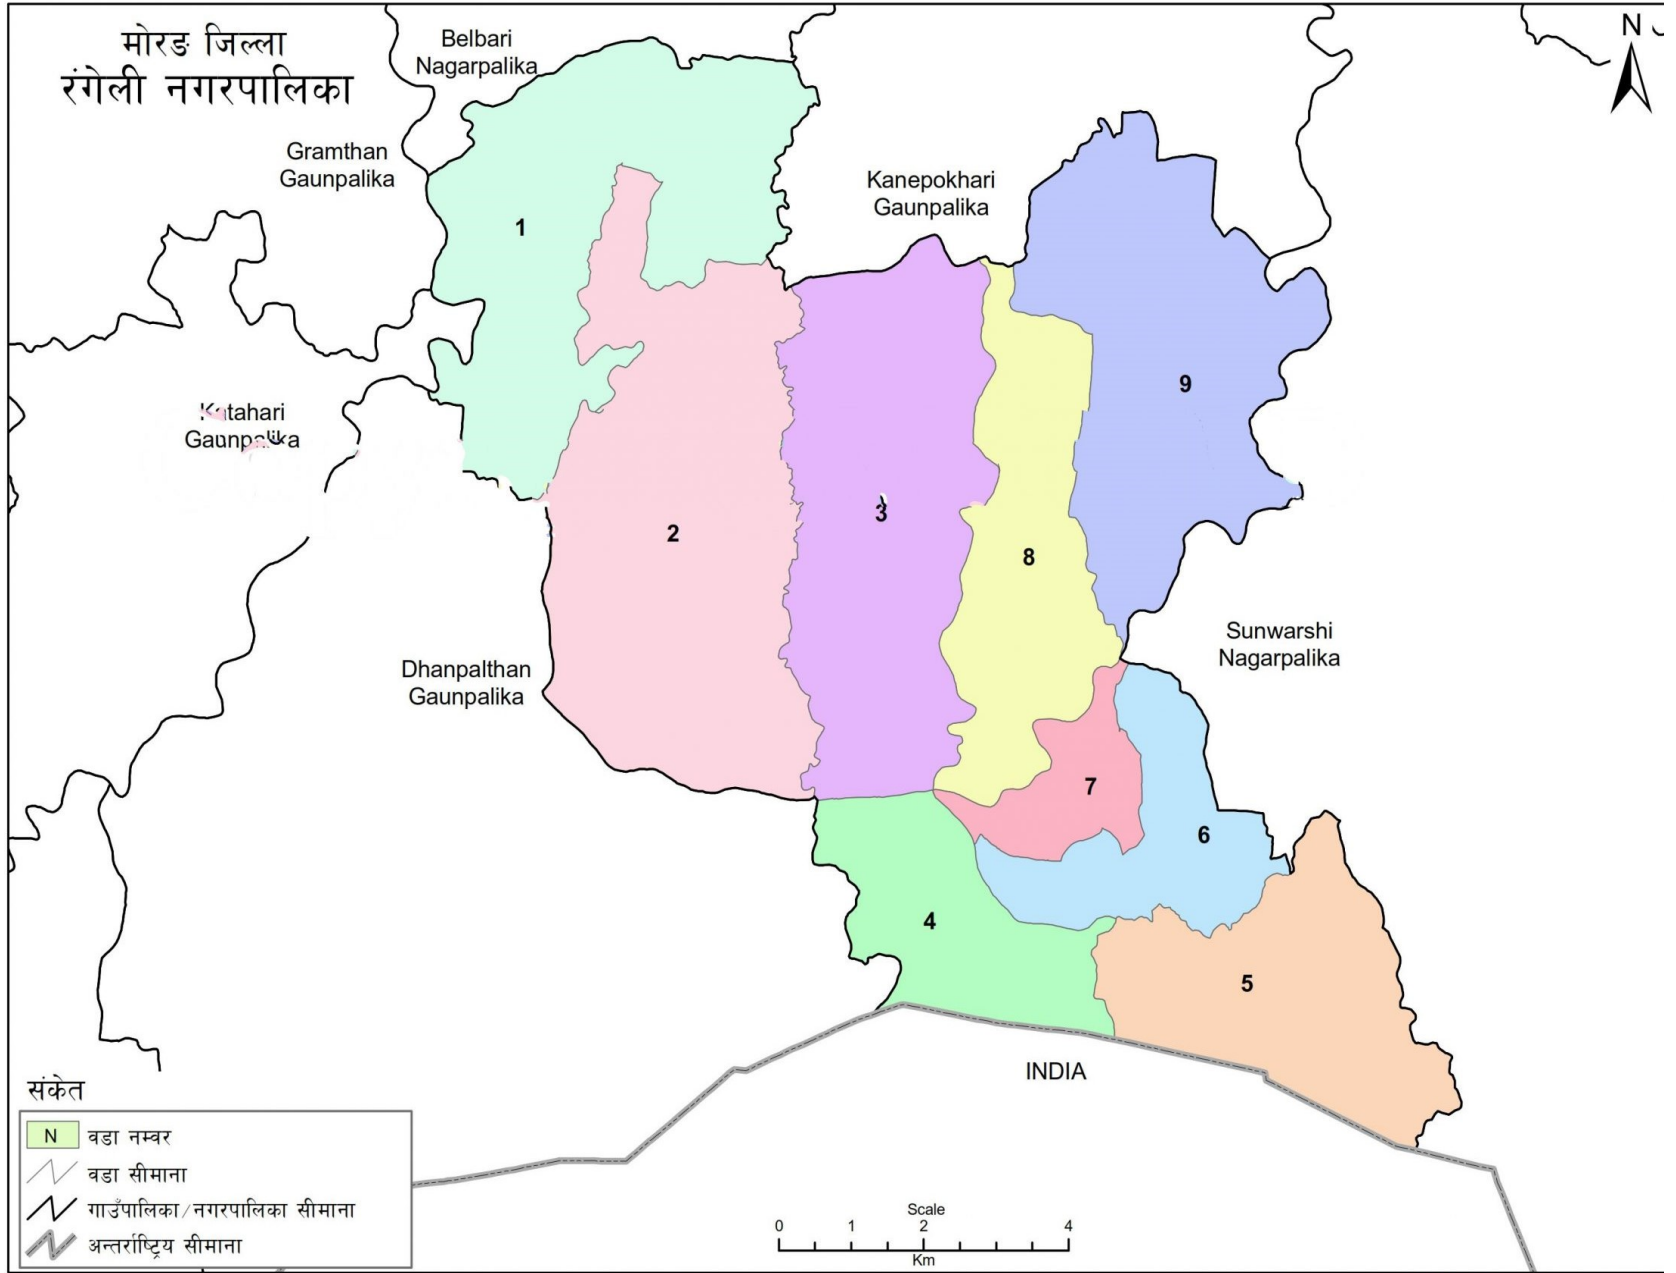

स्रोत: स्थलरूप नक्सा (स्केल १:२५,०००/१:५०,०००), नापी विभाग र जनगणना २०६८, केन्द्रिय तथ्यांक विभाग
तयार पार्ने: गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग



TARGET POPULATION



Population	Total Number
Total Population	58487
Under 1 year	1227
Under 2 years	2568
12-23 months	1341
6-59 months	5760
12-59 months	5146
Under 5 years	6373
Female Pop 15-49 years	16304
MWRA 15-49 years	12358
Expected live birth	1266



SERVICE OUTLETS



Service outlet	Total Number
Hospital	1
Health Post	3
Urban Health Center	1
Community Health Unit	0
Basic Health Service Center	5
EPI Clinic	20
PHC /ORC	12
Birthing Centre/CEOC	2
DOTS Center/Sub-center	4
ART center	0
Safe Abortion sites	2
Adolescent Friendly Health Center	4
Ayurvedic institutions	1
FCHV	36
Private Hospital	2
Pharmacy	12
I/NGO	3
Ambulance/ Sabbahan	2



HUMAN RESOURCE



Categories	Sanctioned post (Number)	Fulfilled		Filled in contract (Karar) (Number)	Recruited using local resources (Number)
		Number	%		
Medical Doctor	2	1	50%	9	7
HA/Sr. AHW	11	11		5	5
Staff Nurse/SR.ANM	8	6		7	7
AHW	7	7		10	10
ANM	6	6		6	6
Lab staff	2	2		4	4
Radiography Staff	1	1			
Statistician/IT staff (Data management)	-	-		1	1
Others(ka sa)	6	4		2	18
Total					



PHYSICAL INFRASTRUCTURE AND OTHER RESOURCES




क्र.सं.	बिबरण	संख्या
१	आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा (जग्गाधनी पूर्जा) भएका स्वास्थ्य संस्था	6
२	आफ्नै भवन भएका स्वास्थ्य संस्था	10
३	खानेपानीको नियमित उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था	10
४	स्वास्थ्यजन्य फोरमहिलाको उचित ब्यबस्थापन गरेका स्वास्थ्य संस्था	1
५	टेलिफोनको उपलब्धता (Landline, Mobile) भएका स्वास्थ्य संस्था	9
६	बिद्युतको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था	9
७	सोलार ब्याकप भएका स्वास्थ्य संस्था	2
८	इन्टरनेट सुबिधा भएका स्वास्थ्य संस्था	10
९	एम्बुलेन्स सेवाको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था	1



HMIS REPORTING STATUS



■ 2076/77 ■ 2077/78 ■ 2078/79






REPORTING STATUS VS TIMELY REPORTING 2076/77



■ % of report received ■ % of timely reporting






PROGRESS OF ANNUAL PROGRAM




IMMUNIZATION






IMMUNIZATION: DROPOUT






WASTAGE RATE





Children fully immunized as per NIP schedule






NUTRITION



■ 2076/77 ■ 2077/78 ■ 2078/79






IMNCI




■ 2076/77 ■ 2077/78 ■ 2078/79






SAFE MOTHERHOOD

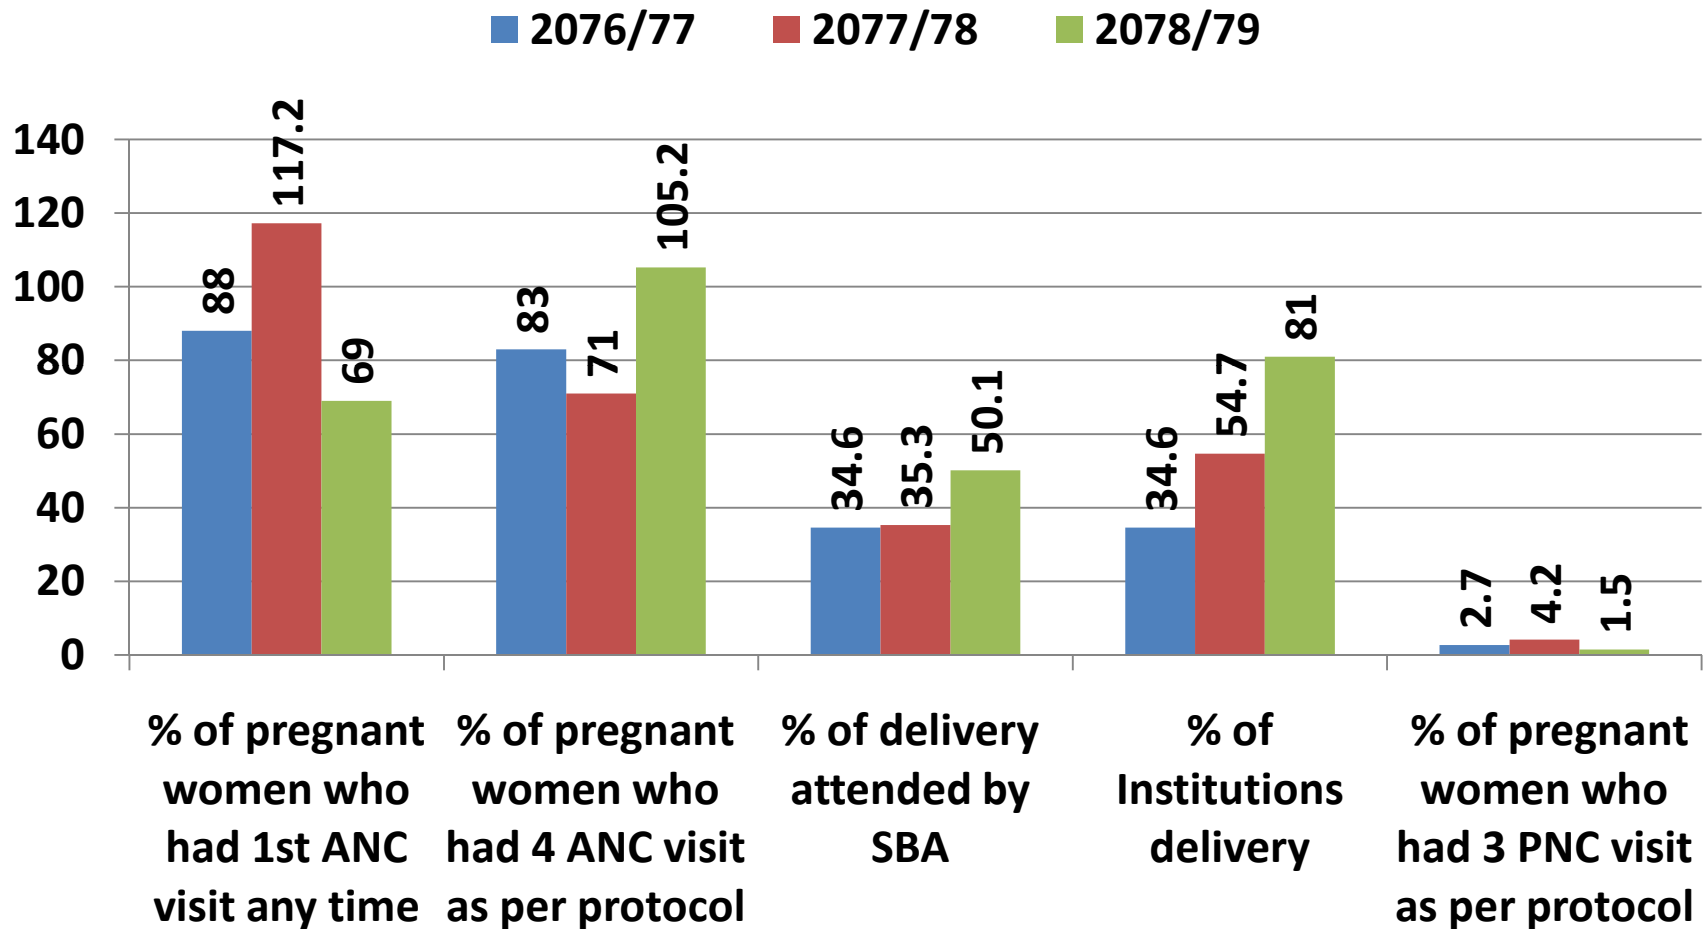




FAMILY PLANNING






FP method new user






FCHV/PHC-ORC/EPI CLINIC






Cases






TUBERCULOSIS/LEPROSY





ZOONOSES





आ.व.०७८/७९ मा कडा रोगीहरुको विवरण



सि.नं.	रोगको किसिम	महिला	पुरुष	जम्मा
१	क्यान्सर रोग	९	८	१७
२	मृगौला सम्बन्धी रोग	३	७	१०
३	मुटु सम्बन्धी रोग	४	५	९
४	टाउकोमा रगत जमेको	०	३	३
५	स्पाईनल इन्ज्युरी	१	०	१
	जम्मा			४० जना




CURATIVE SERVICE



Indicator	FY 2076/077	FY 2077/078	FY 2078/079
Total number of OPD new visit	15998	19936	29804
% of OPD new visits among total population	53.28%	26.34%	29.82%
Total number of new female patients	61.1%	60.23%	59%



TOP TEN MORBIDITY



S.N.	Disease	Number
1	ENT Infection-Rhinitis Cases	845
2	Other Infected Diseases-ARI/Lower Respiratory Tract Infection (LRTI) Cases	642
3	Surgical Problems-Not mentioned Above & Other	622
4	Other Diseases & Injuries-Headache	570
5	Other Diseases & Injuries-Gastritis (APD)	548
6	other Diseases & Injuries-Dog Bite	525
7	Skin Diseases-Fungal Infection (Lichen Planus) Cases	483
8	upper Respiratory Tract Infection (URTI) Cases	438
9	Backache(Muskuloskeletal Pain)	410
10	Communicable-Water/Food Borne-Intestinal Worms Cases	367



गत आ.व.मा स्वास्थ्य शाखाद्वारा संचालित केही गतिविधिहरु



- रंगेली अस्पताल र वबियाबिर्ता स्वास्थ्य चौकीमा SAM case management को लागि OTC केन्द्रको स्थापना
- रंगेली अस्पतालमा व्यवस्थित ईमर्जेन्सि कक्ष सहित २४ घण्टा मेडिकल अफिसरद्वारा सेवा प्रदान साथै सर्जिकल उपचार सेवा प्रारम्भ
- प्रत्येक वडामा कम्तिमा पाच वटा केन्द्रद्वारा वृद्धि अनुगमन कार्यक्रम
- MSS(minimum service standard) को सुचकहरुबाट स्वास्थ्य संस्थाहको अवस्था मापन गरियो र आएका केही समस्याहरुलाई छलफल गरी समाधन गरियो ।
- सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरु आफ्नै भवनबाट सेवा संचालन

- सवै स्वास्थ्य संस्थामा कम्प्युटर ईन्टरनेटको व्यवस्थापन
- तिन वटा सरकारी विध्यालयमा विध्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन
- सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था मा खानेपानिका लागि फिल्टर व्यवस्थान
- प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम लक्षित तिन वटा स्वास्थ्य शिविर संचालन
- स्वास्थ्य चौकिहरुमा निशुल्क RUSG सेवा संचालन
- प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहकार्यमा तिन वटा वडाहरुमा घरमा आधारित वृद्धि अनुगमन कार्यक्रम संचालन
- रंगेली अस्पतालमा एम्बुलेन्स र शव वाहन को व्यवस्थापन



आगामि आ.ब.को योजना



1. सम्पूर्ण १० वटै स्वास्थ्य संस्था डिजिटलाईजेशन (कम्प्युटर ईन्टरनेट व्यवस्थापन) भईसकेकोले रेकर्डिङ रिपोर्टि स्वास्थ्य संस्था स्तरबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने
2. नगरका सम्पूर्ण महिलाको विशेषज्ञ द्वारा यौनरोग, पाठेघर झर्ने, पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर परिक्षण
3. ८० बर्ष माथिका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको स्वास्थ्यकर्मि द्वारा घरमै गई स्वास्थ्य परिक्षण तथा औषधि वितरण
4. तिनवटा वडा (१,३ र ५) मा घरमा आधारित वृद्धि अनुगमन कार्यक्रम संचालन
5. २००० घरलाई निशुल्क स्वास्थ्य विमा



Queries?



THANK YOU

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा

सि.नं	योजनातथाकार्यक्रमको नाम	बजेट	लागत	खर्च	लक्ष	प्रगति	कैफियत
१	संस्थागततथा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० उत्तिर्ण गर्ने छात्राहरुको लागि साइकलवितरण	३४,००,०००		३४,००,०००		१००%	
२	जेष्ठ नागरिक सम्मानकार्यक्रम	५,०००००		००			
३	समूह सदस्यहरुलाई अनुशिक्षण तालिम	१,६५,०००		१,६५,०००	९०जना	१००%	
४	बालबालिकालाई नेतृत्वतथाक्षमताविकास सम्बन्धिकार्यक्रम	१,००,०००		००	बालक्लबमा आबद्ध३० जनाबालबालिका	००	कार्यविधि पास नभएकोहुनाले
५	दिवसीयकार्यक्रम	१०००००		११०००		११%	
६	मा.वि.स्तरीयबालक्लब गठन	१,४०,०००		००	७ वटा सामुदायिकविद्यालय	००	
७	अपाङ्गता परिचयपत्रवितरणबैठक संचालनखर्च	३,४०,०००		२,५१,५५०		७४%	

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा

८	महिलाजनप्रतिनिधितथाअगुवामहिलाहरुलाई महिलाकानुनीअधिकार सम्बन्धी सचेतनाकार्यक्रम	६०,०००		००		००	विविध
९	बालक्लबहरुमाबालबालिकाहरुलाई बालमैत्री स्थानीयशासन सम्बन्धी सचेतनाकार्यक्रम	६०,०००		००			
१०	करुणा फाउण्डेशनसंग साभेदारी कार्यक्रम (अपाङ्गता रोकथामतथापुनस्थापनाकार्यक्रम)	२४,८८,५०२		१४,६७,२६६		५८.९६%	

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
रोजगार सेवाकेन्द्र रंगेली

आ.ब. २०७८/२०७९ असार मसान्तसम्म सम्पन्न भएका पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाहरू ।

क्र. सं.	आयोजनाको नाम	बजेट	लागत	खर्च	लक्ष्य		प्रगति	कैफियत
					श्रमिक संख्या	कार्य दिन		
१.	जर्बी टोलदेखि शुक्रबारेसम्म बाटो सरसफाई गर्ने, रंगेली-७	आई.डि.ए. अनुदान रु.३८,४१००००। मध्ये रु.१३,२७१००।	४५,०५६।	४५,००६।-	६	१३	बातावरण सरसफाई तथा सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको	आई.डि.ए अनुदानको चौमासिक बजेट रकम ढिला निकास तथा स्थानीय तहको निर्वाचन हुदा कार्यमा ढिलाई भएको
२.	राजकुमार साहको घरदेखि नेमाना पासमानकोघरसम्म बाटो स्तरोन्नती कार्य, रंगेली-४		१,३०,८१८।	८८,८५८।-	२२	७	कृषि सडक चौडा बनाईएको लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको	
३.	अकरु रिसिदेबको घरदेखि दक्षिण ह्युम पाइपसम्मको पैनी मर्मत कार्य, रंगेली-९		४१,५२९।	४०,९६७।-	१२	६	बातावरण सरसफाई तथा पैनीको पानी निकास	
४.	मुकेश गिदराको घरदेखि रामबाबुको चिया पसलसम्म सडक सरसफाई, रंगेली-६		१३,९३९।	१३,८४८।-	६	४	बातावरण सरसफाई तथा लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेक	
५.	बक्राहा खोला देखि दक्षिण बौका बोर्डरसम्मका सडकहरूको सरसफाई(२ पटक संचालन गरिएको), रंगेली-४,६,७		२,४६,०३०।	२२९,०६९।-	१२	३९	बातावरण सरसफाई	
६.	सुधमा पासमानको घरदेखि दक्षिण घाँगी खोलासम्म सडक सरसफाई, रंगेली-६		२०,९६६।	२०,७७२।-	६	६	बातावरण सरसफाई तथा	
७.	निचामारी मुसहरी टोलदेखि दक्षिण बिधुत प्रशारण केन्द्रसम्म पैनी खन्ने तथा मर्मत गर्ने, रंगेली-८		५,५३,७२८।	५,३३,१४८। -	२८	३३	पैनीमा पानी निकास सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण	
८.	हरी बरालको घरहुदै शान्ति चोकसम्म जाने पैली मर्मत कार्य, रंगेली-८		४,१५,२९६।	३,५५,४३२। -	२८	२२	पैनीमा पानी निकास सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण	

९.	धनजुवास्थित अनील राजवंशीको घरदेखि दक्षिण खोला जाने बाटोको पैनी मर्मत,रंगेली-९	आई.डि.ए. अनुदान रु ३८,४१००००। मध्ये रु.२४,९४,३७१ ।	१,१३,५१४।	९८,६६७।-	९	१९	पैनीको पानी निकास सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण
१०.	आमतोला चेका खोलादेखि पुर्व दक्षिण हुदै नहरसम्म जाने कृषि सडक स्तरोन्नती,रंगेली-४		१३,७४,००६ ।	१०,७३,२२ ०।-	२७	७१	कृषि सडक स्तरोन्नती ,सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण
११.	बक्राहा पुल हुदै दक्षिण बोर्डरसम्म सडकको दुबैतर्फका सडक बिरुवा गोदमेल सरसफाई आयोजना(२ पटक संचालन), रंगेली-४,६,७		७०,७८६।	६५,२०१।	४	२९	बातावरण सरसफाई लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको
१२.	बाबुलाल सोरेनको घर उत्तर लालोदेबी सरदारको घरपुर्वसम्मको पैनी मर्मत गर्ने, रंगेली-१		५,३१,५७८।	४,३३,३२७।-	४६	१७	कृषि सिचाई पैनी निकास, लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको
१३.	ललित चौधरीको घरदेखि दक्षिण महेश्वर सिंहको खेतसम्मको पैनी मर्मत,रंगेली-१		२,७६,८६४।	२,२६,७६१।-	४६	९	कृषि सिचाई पैनी निकास, लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको
१४.	बाबुराम तिवारीको कामत उत्तर पुर्व जाने भिसि मर्मत गर्ने,रंगेली-१		१,६६,११८।	१,३५,०१८। -	४६	६	कृषि सिचाई पैनी निकास, लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको
१५.	सखुवाथानस्थित कृष्ण प्रसाद भट्टराईको घर हुदै रंगेली न।पा। वडा नं। ८ को सिमानासम्म पैनी सफा गर्ने,रंगेली-९		२,२४,७२९।	१,४८,८६६। -	१०	२८	कृषि सिचाई पैनी निकास, सामुदायिक सम्पत्तीको सुरक्षा लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको
१६.	आर्यघाट त्रौनदेखि दक्षिण दुखन झाको जग्गासम्म जाने पैनी मर्मत कार्य, रंगेली-५		२,१५,१२३।	२,०५,९८९। -	३१	१२	कृषि सिचाई पैनी निकास, सामुदायिक सम्पत्तीको सुरक्षा लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको
१७.	बोर्डरको महाराजथानेखि पश्चिम सिमास्तम्भ सम्म पुरानो पैनी मर्मत,रंगेली-५		१,३२,८९४।	१,०७,३२२। -	३१	६	कृषि सिचाई पैनी निकास, सामुदायिक सम्पत्तीको सुरक्षा लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको

१८.	पब्लिक मा। बिसरसफाई तथा व्यवस्थापन, रंगेली-६	नेपाल सरकार अनुदान श्रोत <u>रु. २९,०७००</u> <u>०।मध्ये</u> रु. १५,८४,४४२।	३९,६८०।	३९,९५८।	११	५	वातावरण स्वच्छता, सामुदायिक सम्पत्तीको सुरक्षा ।
१९.	जनता क्याम्पस खेलकुद मैदान सरसफाई, माटो भरी खाल्दो सम्प्याउने, रंगेली-७		८८,६४०।	४७,८९१।-	१७	७	वातावरण स्वच्छता, सामुदायिक सम्पत्तीको सुरक्षा ।
२०.	कानदेव सोरेनको घरदेखि उत्तर चर्चसम्म लक्ष्मीपुर पैनी मर्मत, रंगेली-२		७,३८,३०४।	४,५०,६३७।	११	७१	कृषि सिचाई सुबिधा
२१.	गणेश माबि को भग्नावशेष व्यवस्थापन कार्य, रंगेली-६		३४,४००।	१८,४६४।-	४	६	वातावरण स्वच्छता, सामुदायिक सम्पत्तीको सुरक्षा ।
२२.	हनुमान मन्दिर ग्राउण्ड माटो भरी सम्प्याउने रंगरोगन, सरसफाई कार्य, रंगेली-७		१,०३,४८७।	८०,७८०।-	१९	११	वातावरण स्वच्छता, सामुदायिक सम्पत्तीको सुरक्षा ।
२३.	युवराज धादेवा कामतदेखि दक्षिण हुँदै मणिलाल थारुको घरपश्चिम दक्षिण जाने शेरुलाल राजवंशीको घरसम्मको पैनी मर्मत बल्सुको घरदेखि नवज्योती प्रा। बि सम्मको पैनी मर्मत, रंगेली-१		४,७०,६६८।	४,२४,६७२।-	४६	१८	कृषि सिचाई सुबिधा, लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको
२४.	दयासागरको घरदेखिचेका खोलाको बाँधसम्मको बाटो मर्मत, रंगेली-२		५,७८,४३२।	८८,२८१।	४०	४	कृषि सडक मर्मत
२५.	कमलझोडा पैनी सरसफाई कार्य, रंगेली-२		१,५४,७९०।	१,५४,०५९।	४६	७	पैनीमा पानी निकास, कृषि क्षेत्र दुबानबाट जोगाउने
२६.	सखुवाथानिस्थित बजगाईको घरपुर्ब हुँदै दक्षिण भागि ताजपुरियाको खेतसम्म पैनी मर्मत कार्य, रंगेली-९		६,६४,४७३।	२,८८,५००। -	१०	५३	कृषि सिचाई सुबिधा, लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको

२७.	मैनावारी स्थिततुलसी रेग्मीको घरदेखि वडा टसम्म पैनीमर्मत , रंगेली-९	नेपाल सरकार अनुदान श्रोत <u>रु. २९,०७००</u> <u>०मध्ये</u> <u>रु. ६,१६,२३६।</u>	८२,१७३।	८०,७८०।	२८	५	कृषि सिचाई सुबिधा,लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको	
२८.	युवाचोकदेखि कानेपोखरी वडा ३ सम्म पैनीमर्मत कार्य,रंगेली-९		१,२९,६००।	१,२९,२४८।	२८	८	कृषि सिचाई सुबिधा,लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको	
२९.	रंगेली न।पा। प्रशासनिक भवन बगैचामा माटो व्यवस्थापन कार्य,रंगेली-७		४६,९०९।	३०,००४।	६	९	वातावरण स्वच्छता, लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको	
३०.	भेरुवादेखि दक्षिणलक्ष्मी ठाकुरको घरसम्म जाने पैनी मर्मत कार्य,रंगेली-५		२६,०७१।	१६,७३३।	२९	१	सिचाई पैनीको मर्मत लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको	
३१.	निचामारीजुगडिया बाँध पैनी निकास खुलाउने आयोजना,रंगेली-८		३७०७९।	३६,९२८।	२८	४	पैनी निकास खुलाउने, दुबान हुन नदिने	
३२.	बहरदार टोलस्थितबाटो मर्मत कार्यमा साझेदारी गरि ग्राभेल व्यवस्थापन कार्य,रंगेली-६		३१,८१८।	३१,७३५।	१८	४	लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको	
३३.	वडा नं एक स्थितकृषी सिचाई पैनी,सडकको नाला, बिर्ता हटिया हाता, बिर्ता मन्दिर, जनप्रियाउ. मा. िव. प्रांगण सरसफाई व्यवस्थापन कार्य,रंगेली-१		१,६८,२०७।	१,३८,४८०।	४०	६	सामुदायिक सम्पत्तिको सुरक्षा वातावरण स्वच्छता, लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको	
३४.	बिशाल बजारदेखिजलिया आधारभुत विद्यालयसम्म गोहीगाडा पैनी मर्मत कार्य,रंगेली-२		१,८९,४७८।	१,५२,३२८।	११	२८	पैनी मर्मत लाभग्राहीले रोजगारी प्राप्त गरेको	
	जम्मा	६७,२१,०००।	६०,२२,१४९।	-		श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी प्रगति प्रतिशत -८९.६१		

रंगेली नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
प्रदेश नं १ मोरङ ,नेपाल

आ.व.२०७८/०७९को सहकारी शाखा कार्यक्रम सम्पन्न प्रगति प्रतिवेदन

सि.नं	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	बजेट	लागत	खर्च	लक्ष	प्रगति	कैफियत
१	आधारभूत सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम	२०००००		२०००००		१००	
२	पुर्व सहकारी शिक्षातालिम	५००००		३१०५०	६०	६२.१०%	
३	सहकारी दिवस कार्यक्रम	५००००		४५०००	४५	९०%	
४	सहकारी व्यवस्थापन तालिम	२०००००		००	००	००	
५	सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन निरिक्षण	८६०००		००		००	
६	सहकारी संस्थाहरुलाई कोपोमिस प्रयोगकर्ता सम्बन्धि तालिम	२०००००		००	००	००	
	जम्मा	७८६०००		२४६०५०		३१%	

कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यातथाचुनौतीहरु
१ सहकारी संस्थाकापदाधिकारीहरुको कार्यक्रममा न्यून उपस्थिति

रंगेली नगरपालिका
पशुपंक्षी सेवा शाखा
रंगेली

आ.व. २०७८।७९ को अषाढ मसान्त सम्ममा सम्पन्न कार्यक्रम/क्रियाकलापहरु

क्र.स.	सम्पन्न भएका क्रियाकलाप	बार्षिक	खर्च विवरण	खर्च प्रतिशत	उपलब्धि	कैफियत
		स्वीकृत बजेट पालिका तर्फ				
१.	नियमित शाखा संचालनका लागि औषधि, केमिकल तथा शाखाबाट निशुल्क वितरण गर्ने औषधि खरीद कार्यक्रम	६०००००।	६०००००।	१००	१) मेडिकल उपचार - ३७७ २) सर्जिकल उपचार - ७ ३) गाइनोलोजिकल - ९३ ४) आन्तरिक परजिवि - ७०४ ५) वाह्य परजिवि - १८२ ६) प्रयोगशाला परिक्षण - २१८ ७) बन्ध्याकरण सेवा - २५२ वटामा प्रदान गरी रोगको निदान तथा उपचार भै पशु धनको संरक्षण भएको	
२.	बर्षे टिओसेन्टी /सुडान आदी घाँसको विउ खरिद, ढुवानी तथा वितरण	३०००००।	२९९९००।	९९.९७	पालिकाका १४२४ जना कृषकलाई १९५० केजी सुडान घाँसको विउ वितरण भै पौष्क तत्वको पूर्तिगरी दुग्द उत्पादनमा टेवा पुगेको	
३.	कृतिम गर्भाधानका लागि आवश्यक लि.ना. सिमेन लजिष्टिक खरिद कार्यक्रम	१५००००।	१५००००।	१००	पालिकाका करिव १३०० कृषकहरुका १९९२ वटा पशु (गाई,भैसी) मा कृतिम गर्भाधान सेवा पुगी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि भएको	काउम्याट खरिदका लागि रकमान्तर भएको
४.	सामुदायिक कुकुर बन्धाकरण तथा रेविज खोप कार्यक्रम	४५००००।	४४९५५०।	९९.९०	पालिकाका १८२ वटा सामुदायिक कुकुरको बन्धाकरण भै संख्यात्मक बृद्धिलाई नियन्त्रण तथा रेविज रोग संक्रमणको न्युनिकरणमा सहयोग पुगेको	
५.	हिउँदे जै,वर्षिम घाँसको विउ खरिद तथा वितरण कार्यक्रम	४०००००।	३९९९५०।	९९.९९	पालिकाका १७८४ जना कृषकलाई २७५०के.जी.जै र ३५० केजी वर्षिम घाँसको विउ वितरण गरिएको	
६.	आय आर्जनका लागि गिरिराज चल्ला वितरण कार्यक्रम(विपन्न वर्ग)	९०००००।	८९९९९७।	१००	विपन्न वर्ग समुदायका ६०० कृषक लाभान्वित भै आय आर्जनमा टेवा पुगेको	

	लक्षित)					
७	दाना वितरण कार्यक्रम	१७००००।	१६७५००।	९८.५३		
८.	व्यावसायिक पशुपालन (बाखा) तालिम (३ दिने) कार्यक्रम	६५०००।	५७८८०।	८९.०५	पालिकाका ५४ जना कृषकहरु प्रतक्ष्य लावान्वित भै नविन्तम प्रविधिको ज्ञान हासिल गरेको	
९	व्यावसायिक पशुपालन (गाई,भैसी) तालिम (३ दिने) कार्यक्रम	६५०००।	६४६४०।	९९.४५	पालिकाका ५४ जना कृषकहरु प्रतक्ष्य लावान्वित भै नविन्तम प्रविधिको ज्ञान हासिल गरेको	
१०.	पशुपंक्षीमा हुने महामारी विरुद्धको खोप कार्यक्रम	१५००००।	१५००००।	१००	२५,५६२ डोज खोप पालिका भित्रका पशु (गाई,भैसी,बाखा,कुखुरा,कुकुर)लाई लगाई प्रतक्ष्य सेवा पुगी संक्रामक रोग नियन्त्रणमा सहयोग भै पशु धनजनको सुरक्षण भएको	काउम्याट खरिदका लागि रकमान्तर भएको
११	५० प्रतिशत अनुदानमा च्याप कटर वितरण	२८०००००।	२८०००००।	१००	२०७ जना कृषकहरुलाई व्यावसायिक बन्न टेवा पुगनुका साथै पशुपालन तर्फ अकसीत गर्न टेवा पुगेको	
१२	काउमेट खरिद, ढुवानी तथा बितरण कार्यक्रम	३०००००।	३०००००।	१००	व्यवसायीक कृषकहरुका उन्नत पशु हरुमा हुने आरथाइटिस,मास्टाईटिस जस्ता रोग बाट बचाउन सहयोग पुगनुका साथै दुधालु पशुलाई आराम प्रदान हुने हँदा उत्पादन बृद्धिमा टेवा पुगेको	अन्य शिर्षकबाट रकमान्तर भई थप खरिद भएको
१३	सूचिकृत व्यवसायीक पशुपालन फार्महरुको स्थलगत प्राविधिक जाँच तथा निशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम	१०००००।	१०००००।	१००	यस पालिकामा सूचिकृत करीव ६७ वटा व्यवसायीक फार्महरुको प्रत्यक्ष स्थलगत निरिक्षणगरी समस्या भएका फार्ममा प्राविधिक सेवा (निःशुल्क औषधि, सुभावा,सल्लाह) पुगी पशु स्वास्थ्य तथा पशु फार्म व्यावस्थापनमा सुधार आएको ।	
१४	बर्डिजो क्यास्टेटर (ठूलो १ सानो १)	४००००।	३९८५०।	९९.६३	पशु बन्ध्याकरणमा सहजता भएको	
१५	रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) खरीद प्रयोग	५००००।	४९५००।	९९	खोप तथा अन्य केमिकल भण्डारणमा सहजता भएको	
१६	उत्कृष्ट बाखाको खोर भएका कृषकलाई प्रोत्साहन (पुरस्कार कार्यक्रम)	३५००००।	३१२५००।	८९.२९		काउम्याट खरिदका लागि रकमान्तर भएको

१७	ट्रेभिज निमाण	२०००००।	२०००००।	१००		च्यापकटर तथा काउम्याट खरिदका लागि रकमान्तर भएको
१८	बहुवर्षे घाँसको सेट्स खरिद तथा वितरण	१५००००।	१५००००।	१००	१०५ जना व्यावसायिक पशुपालक कृषक तथा कृषि फार्महरूले बहुवर्षे घाँस(सुपर नेपियर)को सेट्स प्राप्तगरी पोषिलो बहुवर्षे घाँसको प्रसार भएको ।	
१९	कार्यक्रम अनुगमन खर्च	५००००।	५००००।	१००		
२०	कार्यक्रम भ्रमण खर्च	५००००।	४११५०।	८२.३०		
२१	विविध व्यावस्थापन खर्च	४००००।	१०८८३।	२७.२१		
२२	प्रमाण पत्र छपाई तथा स्टेशनरी खर्च	३००००।	०	०		
	कुल जम्मा	७४१००००।	७२९३३००।	९८.४२		

शसर्त तर्फ आ.व. २०७८।७९

१	कृतिम गर्भाधान मिशन कार्यक्रम	३९४०००।	३९४०००।	१००	पालिकाका करिव १३०० कृषकहरूका १९१२ वटा पशु (गाई,भैसी) मा कृतिम गर्भाधान सेवा पुगी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि भएको	
२	आ.व.२०७७।७८ मा स्थापना भएको गाईको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता	११०००००।	११०००००।	१००		आ.व.२०७७।७८ मा स्थापना भएको गाईका पकेटका लागि पेशकी छफौट गर्दा भुक्तानी भएको
३	इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ	६०००	६०००	१००	प्रदेश तथा संघिय कार्यलयमा मासिक इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ भएको ।	
	जम्मा	१५०००००।	१५०००००।	१००		



रंगेली नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, मोरङ
कार्यालयको कोड : ८०११३४०४३००

Budget appropriation in accordance with program / project

सि.नं.	संकेत	जना/क्रिया/संस्था	वर्ष	स्रोत	लक्ष	इकाई	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
आ.व. : २०७८/७९ अवधि : २०७८/०४/०१-२०७९/०३/३२ बजेट उपशीर्षक : संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)										
८०११३४०४५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)										
१	२.७.२२.८८	स्थानीय तह	२११११	नेपाल सरकार	१०	N/A	१,९०,२०,००	१,८६,११,६२	९७.८५	४,०८,३७८
२	२.७.२२.८८	स्थानीय तह	२११११	नेपाल सरकार	४	N/A	१,२६,८०,००	९१,६९,२६९	७२.३१	३५,१०,७३१
३	२.७.२२.६८	कोभिड १९	२११३३	नेपाल सरकार	१०	पटक	५०,०००	५०,०००	१००.००	०
४	१	केश वेशको	२११३५	नेपाल सरकार	१	पटक	८,८९,०००	८,२०,३७१	९२.२८	६८,६२९
५	२.७.२२.११८	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य	२११३५	नेपाल सरकार	१०	पटक	४२,०३,०००	३९,५२,६१८	९४.०४	२,५०,३८२
६	२.७.२२.१२९	मातृ तथा बाल स्वास्थ्य	२११३५	नेपाल सरकार	१०	N/A	९,००,०००	६,१२,६१३	६८.०७	२,८७,३८७
७	२.७.२२.१२७	सिबिआईएमएस/सिआई	२११३५	नेपाल सरकार	१०	N/A	२,००,०००	१,९९,९२१	९९.९६	७९
८	२.७.२२.६७	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य	२११३५	नेपाल सरकार	१०	पटक	१०,००,०००	१०,००,०००	१००.००	०
९	२.७.२२.२१८	परिवार नियोजन	२११३५	नेपाल सरकार	१०	N/A	३,३२,०००	१,२१,६२०	३६.६३	२,१०,३८०
१०	२.७.२२.६१७	स्थलगत अनुसंधान	२११३५	नेपाल सरकार	१०	N/A	४५,०००	४५,०००	१००.००	०
११	२.७.२२.६१७	स्वास्थ्य संस्था	२११३५	नेपाल सरकार	१०	पटक	४५,०००	४५,०००	१००.००	०
१२	२.७.२२.३३०	बिरामी नव	२२५२२	नेपाल सरकार	१०	N/A	२,००,०००	०	०.००	२,००,०००
१३	२.७.२२.४२४	पालिका स्तर	२२५२२	नेपाल सरकार	१०	N/A	२,९९,०००	२,९९,०००	१००.००	०
१४	२.७.२२.४२४	कोभिड १९	२२५२२	नेपाल सरकार	१०	N/A	१,८७,०००	१,८७,०००	१००.००	०
१५	२.७.२२.१७९	विद्यालय स्वास्थ्य	२२५२२	नेपाल सरकार	१०	पटक	१,००,०००	०	०.००	१,००,०००
१६	२.७.२२.१३१	पोषण कार्यक्रम	२२५२९	नेपाल सरकार	१०	पटक	९,७९,०००	७,५०,५७०	७६.६७	२,२८,४३०
१७	२.७.२२.६४७	उपचारात्मक	२२५२९	नेपाल सरकार	१०	पटक	५,००,०००	४,९७,०००	९९.४०	३,०००
१८	२.७.२२.१०२	पालिका स्तर	२२५२९	नेपाल सरकार	१०	पटक	१,००,०००	१,००,०००	१००.००	०
१९	२.७.५.५	पशुपंक्षी आदी	२२५२९	नेपाल सरकार	१०	पटक	२०,०००	२०,०००	१००.००	०
२०	२.७.२२.६१७	क्षयरोगका जोखिम	२२५२९	नेपाल सरकार	१०	पटक	१,४६,०००	१,४३,४५०	९८.२५	२,५५०
२१	२.७.२२.६४७	आधारभूत	२२५२९	नेपाल सरकार	१०	पटक	१६,००,०००	१६,००,०००	१००.००	०
२२	२.७.२२.६१७	कम्युनिटी इन्टर	२२५२९	नेपाल सरकार	१०	पटक	६४,०००	५१,६१५	८०.६५	१२,३८५
२३	२.७.२२.४२४	नियमित ख	२२७११	नेपाल सरकार	१०	पटक	२,००,०००	१,८१,१००	९०.५५	१८,९००
२४	२.७.२५.४८	औलो तथा	२२७११	नेपाल सरकार	१०	पटक	१०,१०,०००	९,५५,३१९	९४.५९	५४,६८१
२५	२.७.५.६	विभिन्न स	२२७११	नेपाल सरकार	१०	पटक	१,२०,०००	१०,०००	८.३३	१,१०,०००
२६	१	कोभिड मह	२७२१२	नेपाल सरकार	१	पटक	०	०	०.००	०
२७	१	कोभिड-१९	२७२१२	नेपाल सरकार	९६४	N/A	९६,४०,०००	९५,६०,०००	९९.१७	८०,०००
२८	२	रंगेलि अस्प	२७२१२	नेपाल सरकार	१	पटक	३,००,००,००	२,९९,९९,५५	९९.९९	४५०
२९	१	माग तथा	२७२१२	नेपाल सरकार	१	पटक	१५,२५,०००	९,१३,७३०	५९.९२	६,११,२७०
३०	२	ICU/PICU/H	३११२२	नेपाल सरकार	१	पटक	१,२४,३०,००	१,२४,३०,००	१००.००	०
३१	११.३.७.९	स्वास्थ्य सु	३११५९	नेपाल सरकार	१०	N/A	२,००,०००	१,९९,९९९	९९.९९	१
कुल जम्मा							९,८६,८४,००	९,२५,२६,३६	९३.७६	६१,५७,६३३



रंगेली नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मोरङ
कार्यालयको कोड : ८०११३४०४३००

आ.व. ०७८/७९ मा संचालित आयोजना/कार्यक्रमहरूको वार्षिक लक्ष्य प्रगति तथा समिक्षा

बजेट उपशिर्षक -८०११३४०४१०१ रंगेली नगरपालिका

बजेट उपशिर्षक नं.

(रकम रु. हजारमा)

क्रम संख्या	कार्यक्रम / क्रियाकलापहरू	इकाई	वार्षिक बजेट		वार्षिक लक्ष्य			यस अवधिभित्रको लक्ष्य			यस अवधिभित्रको भौतिक प्रगति			यस अवधिभित्रको खर्च		कैफियत
			नेपाल सरकार	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	बजेट	सूचक	भार	प्रतिशत	रकम रु.	प्रतिशत		
१	कविर स्थान कुटी निर्माण । वडा नं. १	थान	२००.००	१.००	०.०००७	२००.००	१.००	०.०००७	२००.००	१.००	०.००१	१००.००	२००.००	१००.००		
२	गदिघट्टा रिषिदेव टालमा अधुरा दिनाभद्री मन्दिर । वडा नं. १	थान	२००.००	१.००	०.०००७	२००.००	१.००	०.०००७	२००.००	१.००	०.००१	१००.००	१५२.००	७६.००		
३	कावा टोली सडक स्तरोन्नती माटा तथा गाभेल-४०० मी । वडा नं. १	किमी	५००.००	०.४०	०.००१७	५००.००	०.४०	०.००१७	५००.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	०.००		
४	पोखरी टोल पोखरीमा प्लम कन्क्रिट वडा - 1	रमी	१०००.००	१७५.००	०.००३४	१०००.००	१७५.००	०.००३४	१०००.००	१३७.००	०.००३	७८.२९	५१३.००	५१.३०		
५	राविलाल राजवंशीको घर देखि मुसहरी हुँदै पोखरी टोलको नहर सम्म रिटनिङ्ग वाल सहित -१.५ कि.मि सडक स्तरोन्नती । वडा नं. १	किमी	२५००.००	१.२५	०.००८६	२५००.००	१.२५	०.००८६	२५००.००	१.२५	०.००९	१००.००	२४६०.००	९८.४०		
६	हनुमान मन्दिर देखि मजरटाल नहर हुँदै विशाल बजार हस्त मायाको घर सम्म -१.५ कि.मि सडक स्तरोन्नती । वडा नं. १	किमी	१६००.००	१.७०	०.००५५	१६००.००	१.७०	०.००५५	१६००.००	१.७०	०.००६	१००.००	१५८५.००	९९.०६		
७	श्री प्रसादको घर देखि महेन्द्र टाल हुँदै गुल्टेन सरदारको घर सम्म ३ वटा होमपाइप सहित सडक स्तरोन्नती-१ कि.मि। वडा नं. १	किमी	१६००.००	१.००	०.००५५	१६००.००	१.००	०.००५५	१६००.००	०.९५	०.००५	९५.००	१५९०.००	९९.३८		
८	जरायत घता खालामा सिचाई (बेलबारी सिमाना) । वडा नं. १	गेट	८००.००	३.००	०.००२८	८००.००	३.००	०.००२८	८००.००	३.००	०.००३	१००.००	०.००	०.००		
९	जरायत घता खालामा सिचाई दिव्यराज टाल माथि । वडा नं. १	गेट	१२००.००	२.००	०.००४१	१२००.००	२.००	०.००४१	१२००.००	२.००	०.००४	१००.००	१२००.००	१००.००		
१०	जरायतबाट पूर्व जान सडकमा कल्भर्ट निर्माण । वडा नं. १ डब्ल	थान	३५००.००	१.००	०.०१२०	३५००.००	१.००	०.०१२०	३५००.००	१.००	०.०१२	१००.००	२१८८.००	६२.५१		
११	भवरीटोल छिर्ने बाटामा कल्भर्ट निर्माण । वडा नं. १	थान	१३००.००	१.००	०.००४५	१३००.००	१.००	०.००४५	१३००.००	१.००	०.००४	१००.००	८००.००	६१.५४		
१२	रामराई टोलमा कल्भर्ट । वडा नं. १	थान	७००.००	१.००	०.००२४	७००.००	१.००	०.००२४	७००.००	१.००	०.००२	१००.००	५९९.००	८५.५७		
१३	समावशा चाक उत्तर सिचाई आयोजना (ऋषि राई) । वडा नं. १	रमी	६००.००	२०.००	०.००२१	६००.००	२०.००	०.००२१	६००.००	२०.००	०.००२	१००.००	५९९.००	९९.८३		
१४	सिचाईका लागि सामाबाध निर्माण (कयर खाला) बहुवर्ष योजना । वडा नं. १	थान	५०००.००	१.००	०.०१७२	५०००.००	१.००	०.०१७२	५०००.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	०.००		
१५	भवरी टाल थानका ईटाको वालका घरावरा । वडा नं. १	रमी	५००.००	१६५.००	०.००१७	५००.००	१६५.००	०.००१७	५००.००	१६५.००	०.००२	१००.००	४८९.००	९७.८०		
१६	राइटाल जान बाटामा साना चौतारी निर्माण। वडा नं. १	सेट	१००.००	१.००	०.०००३	१००.००	१.००	०.०००३	१००.००	१.००	०.०००	१००.००	९६.००	९६.००		
१७	खुल्ला जिम । वडा नं. १	सेट	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००२	१००.००	५००.००	१००.००		
१८	ग्रामथान मन्दिर सगरदिना । वडा नं. १	थान	१५०.००	१.००	०.०००५	१५०.००	१.००	०.०००५	१५०.००	१.००	०.००१	१००.००	१४५.००	९६.६७		
१९	दुर्गा मन्दिर बिर्ता बजार	थान	७००.००	१.००	०.००२४	७००.००	१.००	०.००२४	७००.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	०.००		

२०	बैठार इदगाहको टहरा निर्माण । वडा नं. १	थान	२००.००	१.००	०.०००७	२००.००	१.००	०.०००७	२००.००	०.००	०.०००	०.००	१९५.००	९७.५०
२१	बेलबारी सिमानाको धिमालहरूको ग्रामथान तारजाली घेरावेरा । वडा नं. १	रमी	५००.००	८८.००	०.००१७	५००.००	८८.००	०.००१७	५००.००	८७.५०	०.००२	९९.५३	४४५.००	८९.००
२२	बेलबारी सिमानामा रहका डिपु चाकमा प्रतिकालय निर्माण -१	थान	३००.००	१.००	०.००१०	३००.००	१.००	०.००१०	३००.००	१.००	०.००१	१००.००	३००.००	१००.००
२३	बाल जुगेश्वर आश्रममा टहरा निर्माण रंगेली १	थान	१००.००	१.००	०.०००३	१००.००	१.००	०.०००३	१००.००		०.०००	०.००		०.००
२४	विर्ता हटियामा एजाड वाल पड्ड बलक शाचालय कम्पाउन्ड वाल निर्माण ।	रमी	४५०९.४२	२२०.००	०.०१५५	४५०९.४२	२२०.००	०.०१५५	४५०९.४२	२२०.००	०.०१६	१००.००	४५०९.००	९९.९९
२५	बविया स्कुल देखि पूर्व किचक थान घेरावेरा । वडा नं. १	रमी	१५०.००	५०.००	०.०००५	१५०.००	५०.००	०.०००५	१५०.००	४८.६०	०.००१	९७.२०	१४६.००	९७.३३
२६	अधुरा गाउघर क्लिनिक निर्माण सगरदिना। वडा नं. १	थान	१५०.००	१.००	०.०००५	१५०.००	१.००	०.०००५	१५०.००	१.००	०.००१	१००.००	१४६.००	९७.३३
२७			०.००											
२८	महिला र बालबालिका अफिस भवनमा पाल तारजाली घेरावेरा(सानो सगरदिना)	रमी	५००.००	५०.००	०.००१७	५००.००	५०.००	०.००१७	५००.००	५०.००	०.००२	१००.००	४९६.००	९९.२०
२९	उमाकान्तको घर देखि हाम बहादुर खड्काको घर हुँदै शिव नारायणको घर सम्म र रामजानकी मन्दिर देखि दिर्घ कार्कीको घर सम्म- १ कि मि ग्राभेल		१०००.००	१.६०	०.००३४	१०००.००	१.६०	०.००३४	१०००.००	१.५५	०.००३	९६.८८	९९५.००	९९.५०
३०	डिपु चाक देखि समावेश चाक सम्म माटा र ग्राभेल सहित - ४०० मि		१०००.००	०.५०	०.००३४	१०००.००	०.५०	०.००३४	१०००.००	०.५९	०.००३	९७.००	१०००.००	१००.००
३१	राम राइका घर देखि पूर्णमा सामुदायिक वन सम्म ग्राभेल १ कि मि	किमी	१०००.००	०.२५	०.००३४	१०००.००	०.२५	०.००३४	१०००.००	०.२५	०.००३	१००.००	९९०.००	९९.००
३२	राम राइको घर पश्चिम कल्भर्ट ३मी	थान	०.००	१.००	०.००००		१.००	०.००००	०.००	१.००	०.०००	०.००		०.००
३३	सगरदिना देखि गुम्मा खवासका घर हुद शिव मन्दिर सरदार टोल - झोलुङ्गे पुल सम्म १.५ कि मि ग्राभेल	किमी	१५००.००	१.७०	०.००५२	१५००.००	१.७०	०.००५२	१५००.००	१.७०	०.००५	१००.००	१४८६.००	९९.०७
३४	भमरीटोलको आर्यघाट निर्माण	थान	१०००.००	१.००	०.००३४	१०००.००	१.००	०.००३४	१०००.००	१.००	०.००३	१००.००	९७९.००	९७.९०
३५	सगरदिना शिव मन्दिर रंगरोगन	थान	२५०.००	१.००	०.०००९	२५०.००	१.००	०.०००९	२५०.००	१.००	०.००१	१००.००	२४४.००	९७.६०
३६	सिंघाइका लागि कूलो निर्माण सगरदिना	रमी	२००.००	१०.००	०.०००७	२००.००	१०.००	०.०००७	२००.००	१०.००	०.००१	१००.००	१९५.००	९७.५०
८०११३४०४२०२	रंगेली नगरपालिका वडा नं.२ नया													
३७	दिनाटोलमा अधुरा आम शान्ति भवन निर्माण । वडा नं. २	थान	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००२	१००.००	४८९.००	९७.८०
३८	गिरीराजको घर उत्तर सुकुम्बासी टोल सडक ग्राभेल । वडा नं.२	किमि	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००					
३९	चर्च देखि विशालबजार चौकसम्म ग्राभेल रालर ग्रेडर । वडा नं. २	किमि	१५००.००	२.००	०.००५२	१५००.००	२.००	०.००५२	१५००.००	२.००	०.००५	१००.००	१४९९.००	९९.९३
४०	झाडा मडाटाल हुद आर्यघाटको खालामा ग्यावियन वालको रिटेनिड वाल । वडा नं. २	रमी	८००.००	२४.००	०.००२८	८००.००	२४.००	०.००२८	८००.००	२४.००	०.००३	१००.००	७९८.००	९९.७५
४१	बेतौना सथाल बस्तिमा कलभर्ट निर्माण	थान	८००.००	१.००	०.००२८	८००.००	१.००	०.००२८	८००.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	०.००
४२	बिरानटोल दक्षिण कल्भर्ट निर्माण रंगेली २	थान	१०००.००	१.००	०.००३४	१०००.००	१.००	०.००३४	१०००.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	०.००
४३	बिरानटोल पश्चिम नहरसम्म ५०० मा. सडक स्तरोन्नती । वडा नं. २	किमि	७००.००		०.००२४	७००.००	०.००	०.००२४	७००.००		०.०००	०.००		०.००

४४	रंगेली हलाकी सडक मगलबार नहर देखि वेलवारी सिमानासम्म माटो ग्राभेल रोलर ग्रेडर । वडा नं. २	किमि	८०००.००	४.८०	०.०२७५	८०००.००	४.८०	०.०२७५	८०००.००	४.७०	०.०२७५	९७.९२	८०००.००	१००.००
४५	खानेपानी ट्यूबेल जडान -२	सेट	२००.००	२४.००	०.०००७	२००.००	२४.००	०.०००७	२००.००	२४.००	०.००१	१००.००	२००.००	१००.००
४६	कुकुर खोला बाँध निर्माण - २	गेट	२००.००		०.०००७	२००.००	०.००	०.०००७	२००.००		०.०००	०.००		०.००
४७	काठमहल अधुरो बाटो निर्माण-२	किमि	१५०.००	०.०५	०.०००५	१५०.००	०.०५	०.०००५	१५०.००	०.०५	०.००१	१००.००	१४४.००	९६.००
४८	जलवा चाक उतर आम आचार्यको घर अगाडि सडक निर्माण -२	किमि	१५०.००	०.३०	०.०००५	१५०.००	०.३०	०.०००५	१५०.००	०.२८	०.०००	९१.६७	१३४.००	८९.३३
४९	प्रगतिशिल मा.वि को ग्रेडर लगाई खेल मैदान मर्मत र फुटबल पोस्ट निर्माण । वडा नं.२	किमि	१५०.००		०.०००५	१५०.००	०.००	०.०००५	१५०.००		०.०००	०.००		०.००
५०	मगलबारे खेलमैदान । वडा नं.२	बमी	१००.००		०.०००३	१००.००	०.००	०.०००३	१००.००		०.०००	०.००		०.००
५१	सरस्वती आधारभूत विद्यालय बेतौना झोडा -२	प्रतिशत	५०.००	१००.००	०.०००२	५०.००	१००.००	०.०००२	५०.००	१००.००	०.०००	१००.००	५०.००	१००.००
५२	सिचाई बोरिङ्ग जडान -२	थान	४५०.००	९.००	०.००१५	४५०.००	९.००	०.००१५	४५०.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	०.००
५३			०.००		०.००००	०.००	०.००	०.००००	०.००		०.०००	०.००		०.००
५४	कटखाला धाक सयालका घरदेखि उतर सत्य नारायण थान सम्म बाटो स्तरउन्नती तथा गावेल		२५०.००		०.०००९	२५०.००	०.००	०.०००९	२५०.००		०.०००	०.००		०.००
५५	खोरिया अधुरो बाटो गावेल तथा स्तरउन्नती		२५०.००		०.०००९	२५०.००	०.००	०.०००९	२५०.००		०.०००	०.००		०.००
५६	चतुरको घर उतर सुवेदीको घरसम्म गावेल		१५०.००		०.०००५	१५०.००	०.००	०.०००५	१५०.००		०.०००	०.००		०.००
५७	तुरी टोल देखि चानीको घरसम्म अधुरो गावेल		२००.००		०.०००७	२००.००	०.००	०.०००७	२००.००		०.०००	०.००		०.००
५८	बृद्धीलाल सरदारको घर पूर्व नया कल्भर्ट सम्म अधुरो गावेल		३००.००		०.००१०	३००.००	०.००	०.००१०	३००.००		०.०००	०.००		०.००
५९	भिम बहादुर पाडलका घर दक्षिण चौधरी टोलसम्म गावेल		१५०.००		०.०००५	१५०.००	०.००	०.०००५	१५०.००		०.०००	०.००		०.००
६०	हम बहादुर थापाका कामत देखि उतर फागुलाल टोलसम्म गावेल		२००.००		०.०००७	२००.००	०.००	०.०००७	२००.००		०.०००	०.००		०.००
६१	अन्नत मन्दिर अधुरो निर्माण	प्रतिशत	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१	१००.००	३००.००	१००.००
६२	कुकुर खोलामा बाँध थप रकम	प्रतिशत	१००.००		०.०००३	१००.००	०.००	०.०००३	१००.००		०.०००	०.००		०.००
६३	कठमहाल मन्दिर थप रकम	प्रतिशत	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००	१००.००	१००.००	१००.००
६४	जलिया स्कुलमा पक्की कम्पाउण्ड बाल निर्माण	रमी	३००.००	२९.००	०.००१०	३००.००	२९.००	०.००१०	३००.००	२९.००	०.००१	१००.००	२८९.००	९६.३३
६५	दौलतपुर स्कुल पश्चिम भुवा खोलासम्म आर सि सि होमपाईप बाटोस्तरउन्नति तथा गावेल	किमि	२५०.००	०.२०	०.०००९	२५०.००	०.२०	०.०००९	२५०.००	०.२०	०.००१	१००.००	९३.००	३७.२०
६६	वडा कार्यालय सुधार कार्यक्रम बाउण्डरी वाल निर्माण कार्य	रमी	५००.००	२५.००	०.००१७	५००.००	२५.००	०.००१७	५००.००	२४.२५	०.००२	९७.००	३३६.००	६७.२०
६७	विरनिया पैनीमा आर सि सि कल्भर्ट निर्माण	थान	७५०.००		०.००२६	७५०.००	०.००	०.००२६	७५०.००		०.०००	०.००		०.००
६८	शिवराम खवास टोलमा गावेल	किमि	४००.००		०.००१४	४००.००	०.००	०.००१४	४००.००		०.०००	०.००		०.००
६९	सत्य आर्यघाटमा स्टेप सिडी तथा तारवाल घेरावेरा गर्न	प्रतिशत	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१	१००.००	२९३.००	९७.६७
७०	सहकारी चाक स्थित बृद्धबृद्धा विश्राम स्थल निर्माण	सेट	३००.००	१.००	०.००१०	३००.००	१.००	०.००१०	३००.००	१.००	०.००१	१००.००	२९३.००	९७.६७

७१	भलवा बालकेन्द्र मर्मत	प्रतिशत	५०.००	१००.००	०.०००२	५०.००	१००.००	०.०००२	५०.००	१००.००	०.०००	१००.००	४८.००	९६.००	
७२	मुस्लिम टालमा मुस्लिम स्कुलको पक्की वाल कम्पाउण्ड वाल निर्माण		१५०.००		०.०००५	१५०.००	०.००	०.०००५	१५०.००		०.०००	०.००		०.००	
७३	महेशटोल दक्षिण नयाँ बाटोमा र सुशिला मुर्मू घर दक्षिण ह्यूमपाईप कल्भर्ट जडान २	थान	५००.००	३.००	०.००१७	५००.००	३.००	०.००१७	५००.००	३.००	०.००२	१००.००	२३५.००	४७.००	
७४	महेशटोल दक्षिण नयाँ बाटोमा ग्राभेल २	किमि	५००.००	०.२०	०.००१७	५००.००	०.२०	०.००१७	५००.००	०.२०	०.००२	१००.००	२४६.००	४९.२०	
७५	विराटेश्वर शिव मन्दिरको सामुदायिक भवन (बर्मेली टोल) । वडा नं.३	प्रतिशत	१६४१.००	१००.००	०.००५६	१६४१.००	१००.००	०.००५६	१६४१.००	१००.००	०.००६	१००.००	१६४१.००	१००.००	
७६	विश्व बूढाथोकीको गाउ दिना टालमा कर्मकार सामुदायिक भवन । वडा नं.३	प्रतिशत	१४००.००	१००.००	०.००४८	१४००.००	१००.००	०.००४८	१४००.००	६०.००	०.००३	६०.००	७१८.००	५१.२९	
७७	वडा कार्यालय घेराबेरा तथा रडोकन - ३	प्रतिशत	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००	१००.००	९९.००	९९.००	
७८	सार्वजनिक आधारभूत विद्यालय फर्निचर खरिद - ३	सेट	१००.००	२.००	०.०००३	१००.००	२.००	०.०००३	१००.००	०.००	०.०००	०.००		०.००	
७९	आमताला अर्जुन कार्कीको घर छेउउतर र दक्षिण प्लम कन्क्रिट बडा न ३	रमी	१५००.००	१३०.००	०.००५२	१५००.००	१३०.००	०.००५२	१५००.००	०.००	०.०००	०.००		०.००	
८०	कुमार श्रेष्ठ घर पूर्व सडक स्तरोन्नती - ३	किमि	१००.००	०.१०	०.०००३	१००.००	०.१०	०.०००३	१००.००	०.१०	०.०००	१००.००		०.००	
८१	दिनदयाल कामत पूर्व पिट्टी टाल जान सडक निर्माण - ३	किमि	३५०.००	०.२०	०.००१२	३५०.००	०.२०	०.००१२	३५०.००	०.१६	०.००१	८०.००	३४७.००	९९.१४	
८२	निसानथान पछाडा पिपलचोकमा फलचा निर्माण - ३	थान	१००.००	१.००	०.०००३	१००.००	१.००	०.०००३	१००.००	१.००	०.०००	१००.००	९७.००	९७.००	
८३	भाउन्ने आमताला सडक खण्डको दालतपुर स्कुल देखि बाबुसाहेव टोल जाने ओली मोड सम्म स्तरोन्नती । वडा नं.३- 0.6 किमी प्लम कन्क्रीट र 1.60किमी कच्ची सडक	किमि	१५०१२.००	२.२०	०.०५१७	१५०१२.००	२.२०	०.०५१७	१५०१२.००	१.६०	०.०३८	७२.७३	८२३७.००	५४.८७	
८४	स्वर्गद्वारी घाट (चिसाग खोला) । वडा नं.३	थान	१०००.००		०.००३४	१०००.००	०.००	०.००३४	१०००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
८५	रञ्जनी तल स्वर्गद्वारी घाटमा वोरिङ्ग सहित जडान । वडा नं.३	थान	१००.००		०.०००३	१००.००	०.००	०.०००३	१००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
८६	शान्ती आर्यघाट का विरिङ्ग सहित जडान । वडा नं.३	थान	१००.००		०.०००३	१००.००	०.००	०.०००३	१००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
८७	खानेपानी टुयुवेल खरिद-३	सेट	३५०.००	४१.००	०.००१२	३५०.००	४१.००	०.००१२	३५०.००	४१.००	०.००१	१००.००	३५०.००	१००.००	
८८	रञ्जनी हटिया पार्क निर्माण । वडा नं.३	सेट	६०००.००	१.००	०.०२०७	६०००.००	१.००	०.०२०७	६०००.००	०.४०	०.००८	४०.००	२९८९.००	४९.८२	
८९	आमताला मदरसा स्कुल - ३	प्रतिशत	१००.००		०.०००३	१००.००	०.००	०.०००३	१००.००		०.०००	०.००		०.००	
९०	काजमान चाकका फलचा निर्माण (पिपलगाछी छेउ)। वडा नं.३	सेट	१००.००	१.००	०.०००३	१००.००	१.००	०.०००३	१००.००	१.००	०.०००	१००.००	९७.००	९७.००	
९१	कोशी बहुउद्देश्यीय सहकारी लि - ३	प्रतिशत	१००.००		०.०००३	१००.००	०.००	०.०००३	१००.००		०.०००	०.००		०.००	
९२	खुन्ला जिम । वडा नं.३	सेट	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
९३	दक्षिण टाल पोखरी पुरी खलमदान निर्माण । वडा नं.३	प्रतिशत	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००		०.००	
९४	मगलबार श्याम श्रेष्ठको घर अगाडि फलचा निर्माण - ३	थान	५०.००		०.०००२	५०.००	०.००	०.०००२	५०.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
९५	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण (प्रमाणी) दौलतपुर - ३	प्रतिशत	१००.००		०.०००३	१००.००	०.००	०.०००३	१००.००		०.०००	०.००		०.००	
९६	स्वर्गद्वारी परोपकार घाट (चिसाड खोला) - ३	प्रतिशत	५२१.००		०.००१८	५२१.००	०.००	०.००१८	५२१.००		०.०००	०.००		०.००	
९७	रञ्जनी फलचा निर्माण ३	सेट	७९९.००	१.००	०.००२८	७९९.००	१.००	०.००२८	७९९.००	१.००	०.००३	१००.००	५२६.००	६५.८३	

९८	सिंचाइबाँध तथा गेट निर्माण कडिया खोला ३(खेला चिरेको)	प्रतिशत	७८२.००	१००.००	०.००२७	७८२.००	१००.००	०.००२७	७८२.००	०.३०	०.०००	०.३०	२०५.००	२६.२१	
९९	कृषकहरुलाई सिचाई बोरिड खरिद तथा वितरण	सेट	८००.००	१६.००	०.००२८	८००.००	१६.००	०.००२८	८००.००	१६.००	०.००३	१००.००	८००.००	१००.००	
१००	बडाको पार्श्व चित्र/ प्रोफाइल निर्माण	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	२९७.००	१४८.५०	
१०१	आमतोला ओम शान्ती भवन	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१९८.००	९९.००	
१०२	आमतोला वडा न ४ मजिथान निर्माण	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	५०.००	०.०००	५०.००	५२.००	२६.००	
१०३	मलडबाबा ग्याथान मन्दिर (मनाज ठकदारका घर छेउ) । वडा नं.४	प्रतिशत	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००		०.०००	०.००		०.००	
१०४	वडा नं.४ वडा कार्यालय भवन निर्माण । वडा नं.४	प्रतिशत	६३६८.००	१००.००	०.०२१९	६३६८.००	१००.००	०.०२१९	६३६८.००	५०.००	०.०११	५०.००	३३७९.००	५३.०६	
१०५	कोल्ड स्टोर देखि नहर सम्म सडक ग्राभेल - ४ यज्ञ बहादुर कार्कीको घर सम्म जान सडक निर्माण - ४	किमि	३००.००	०.१५	०.००१०	३००.००	०.१५	०.००१०	३००.००	०.१५	०.००१	१००.००	३००.००	१००.००	
१०६	सिचाई बोरिड खरिद - ४	किमि	३००.००		०.००१०	३००.००	०.००	०.००१०	३००.००		०.०००	०.००		०.००	
१०७	सिचाई बोरिड खरिद - ४	सेट	४१६.००	८.००	०.००१४	४१६.००	८.००	०.००१४	४१६.००	८.००	०.००१	१००.००	४१६.००	१००.००	
१०८	वडा नं.४ को सरसफाई । वडा नं.४		५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
१०९	शौचालय रिड निर्माण तथा वितरण - ४	थान	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	४८९.००	९७.८०	
११०	खुल्ला जिम वडा नं.४ चोप्राहा । वडा नं.४	सेट	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००		०.००	
१११	खुल्ला जिमका लागि टाइल फिटिङ गर्न । वडा नं.४	बमी	२००.००		०.०००७	२००.००	०.००	०.०००७	२००.००		०.०००	०.००		०.००	
११२	खानेपानी ट्यूबेल जडान - ४	सेट	२००.००	२६.००	०.०००७	२००.००	२६.००	०.०००७	२००.००	२६.००	०.००१	१००.००	१९५.००	९७.५०	
११३	जनता मा.वि आमतालाका कम्पाउन्ड घरा वरा । वडा नं.४		२०००.००		०.००६९	२०००.००	०.००	०.००६९	२०००.००		०.०००	०.००		०.००	
११४	दोरिकलालको घर अगाडा पोखरीमा सिँडी ड्रेन कोभर मनोज ठकेदार घर पश्चिम नहरको गेट आमतोला ।		२९०.८०		०.००१०	२९०.८०	०.००	०.००१०	२९०.८०		०.०००	०.००		०.००	
११५	मलडबाबा मन्दिर निर्माण - ४	प्रतिशत	३१८.००	१००.००	०.००११	३१८.००	१००.००	०.००११	३१८.००		०.०००	०.००	२९३.००	९२.१४	
११६	हनुमान मन्दिर बोका बोर्डर - ४	प्रतिशत	३५५.००	१००.००	०.००१२	३५५.००	१००.००	०.००१२	३५५.००		०.०००	०.००	३५०.००	९८.५९	
११७	जनता मा वि आमताला अधुरा शाचालय निर्माण तथा २ सटर निर्माण - ४	थान	५४८.५०	२.००	०.००१९	५४८.५०	२.००	०.००१९	५४८.५०	२.००	०.००२	१००.००	५२४.००	९५.५३	
११८	एकराज बस्नेतको घर देखि दक्षिण झमर बेसराको घर सम्म जाने सडक ग्राभेल होमपाईप जडान	किमि	१७००.००	१.४०	०.००५९	१७००.००	१.४०	०.००५९	१७००.००	१.३८	०.००६	९८.५७	१७००.००	१००.००	
११९	बाका मनाहर साहका घर देखि दक्षिण श्रवन साहको घर हुदै बोर्डर सम्म जाने सडक स्तराउन्नति	रमी	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००		०.००	
१२०	अधुरो ग्राम देवता मन्दिर निर्माण	प्रतिशत	७००.००	१००.००	०.००२४	७००.००	१००.००	०.००२४	७००.००	१००.००	०.००२	१००.००	४६८.००	६६.८६	
१२१	अधुरा दुधेश्वर नाथ शिव मन्दिरंग रागन र दक्षिणमा माटो भरोट तथा ट्रस्ट निर्माण	प्रतिशत	७००.००	१००.००	०.००२४	७००.००	१००.००	०.००२४	७००.००	१००.००	०.००२	१००.००	६९९.००	९९.८६	
१२२	अधुरो राधा कृष्ण मन्दिर निर्माण	प्रतिशत	१०००.००	१००.००	०.००३४	१०००.००	१००.००	०.००३४	१०००.००	१००.००	०.००३	१००.००	९४२.००	९४.२०	
१२३	रघुविर यादवका घरछउ रहका हनुमान मन्दिर निर्माण	प्रतिशत	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१	१००.००	३००.००	१००.००	
१२४	लवटोलि काली मन्दिर घेरा बेरा	रमी	३५०.००	३५.००	०.००१२	३५०.००	३५.००	०.००१२	३५०.००	३५.००	०.००१	१००.००	३५०.००	१००.००	

१२५	विभिन्न बाटोहरू मर्मत तथा माटोको काम अधुरा जय मा लक्ष्मी मन्दिर ठाकुर टाल । वडा नं.५	किमि	४५०.००		०.००१५	४५०.००	०.००	०.००१५	४५०.००		०.०००	०.००	०.००	
१२६	भगवता मन्दिर (हरिकान्त झा घर छउ) निर्माण । वडा नं.५	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	५००.००	१००.००
१२७	बहुवान चाकका अधुरि शिव मन्दिरमा मार्वल तथा टायल । वडा नं.५	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	५००.००	१००.००
१२८	सशस्त्र प्रहरी जान सडकमा कल्भर्ट तथा ग्राभेल रंगेली ५	थान	१०००.००	१.००	०.००३४	१०००.००	१.००	०.००३४	१०००.००	१.००	०.००३	१००.००	९८०.००	९८.००
१२९	सशस्त्र प्रहरी वेस क्याम्प जाने सडक स्तरउन्नती रंगेली ५	किमि	७५०.००	१.५०	०.००२६	७५०.००	१.५०	०.००२६	७५०.००		०.०००	०.००	०.००	०.००
१३०	वडा नं.५ को सुबा पोखरीमा माटो पूर्ण कार्य ५ कुन्ना पनामा प्लम कंक्रीट टवा पर्खाल निर्माण । वडा नं.५	बमी	२५०.००	२२००.००	०.०००९	२५०.००	२२००.००	०.०००९	२५०.००		०.०००	०.००	०.००	०.००
१३१	थानाटालबाट सथाल टाल जान सडक घाघा खोलामा कल्भर्ट ट्रिपल सेल । वडा नं.५	रमी	१०००.००	३५.००	०.००३४	१०००.००	३५.००	०.००३४	१०००.००	३५.००	०.००३	१००.००	८४०.००	८४.००
१३२	आनन्द मन्दिर निर्माण - ५	थान	३५००.००	०.५०	०.०१२०	३५००.००	०.५०	०.०१२०	३५००.००	०.३३	०.००८	६६.००	२२००.००	६२.८६
१३३	आमगाछी प्रहरी चौकीमा फलचा तथा हावा घर निर्माण	प्रतिशत	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००	१००.००	९१.००	९१.००
१३४	खुल्ला जिम वडा न ५	थान	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००२	१००.००	३९४.००	७८.८०
१३५	ग्रामथान मन्दिर जैनपुर वडा न ५	सेट	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००२	१००.००	४९९.००	९९.८०
१३६	ग्रामदेवता रावण चौक वडा नं ५	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१९५.००	९७.५०
१३७	दुखन झाका घर छउ पोखरीमा छटघाट निर्माण । वडा नं.५	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१९५.००	९७.५०
१३८	दिनाभेदी मन्दिर निर्माण - ५	रमी	५००.००	५५.००	०.००१७	५००.००	५५.००	०.००१७	५००.००	५५.००	०.००२	९८.१८	३५६.००	७१.२०
१३९	धर्मनाथ झाका घर छउ पोखरीमा छटघाट निर्माण । वडा नं.५	प्रतिशत	२५०.००	१००.००	०.०००९	२५०.००	१००.००	०.०००९	२५०.००		०.०००	०.००	०.००	०.००
१४०	भेडुवा ठाकुर टोलमा आर्यघाट निर्माण	रमी	५००.००	४५.००	०.००१७	५००.००	४५.००	०.००१७	५००.००	४५.००	०.००२	१००.००	०.००	०.००
१४१	वडा कार्यालय भवन मर्मत - ५	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००
१४२	वडा कार्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण - ५	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००
१४३	शिव मन्दिर घनापट्टी वडा न ५	प्रतिशत	९००.००	१००.००	०.००३१	९००.००	१००.००	०.००३१	९००.००	१००.००	०.००३	१००.००	८८१.००	९७.८९
१४४	जनता मा वि आमगाछी मर्मत वडा न ५	प्रतिशत	९००.००	१००.००	०.००३१	९००.००	१००.००	०.००३१	९००.००	१००.००	०.००३	१००.००	८८१.००	९७.८९
१४५	घाघा पुल देखि पश्चिम बगचा टाल सम्म जान बाटो मर्मत	प्रतिशत	२५०.००	०.००	०.०००९	२५०.००	०.००	०.०००९	२५०.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	०.००
१४६	ठाकुर टाल देखि पश्चिम उतर बगचा सम्म जाने बाटो मर्मत	प्रतिशत	२००.००	०.००	०.०००७	२००.००	०.००	०.०००७	२००.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	०.००
१४७	ठाकुर टाल देखि पश्चिम राजेन्द्र मण्डलका घर सम्म जाने बाटो मर्मत हटाएर जागेश्वर मंडलको घर अगाडिको पोखरीमा स्टेप निर्माण कार्य	प्रतिशत	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००
१४८	लखन सरदारका घर देखि बोर्डर सम्म जान बाटो निर्माण	प्रतिशत	२५०.००	०.००	०.०००९	२५०.००	०.००	०.०००९	२५०.००		०.०००	०.००	०.००	०.००
१४९	आमगाछी मा वि पूर्व राजाधनपाल थान निर्माण	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१९५.००	९७.५०
१५०	आमगाछी हनुमान मन्दिर निर्माण	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	४९७.००	९९.४०

१५३	आमगाछीमा दिनाभद्रीको मन्दिर निर्माण	प्रतिशत	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००		०.०००	०.००	०.००	
१५४	घाघीपुल नजिकको लक्ष्मी मन्दिर निर्माण	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	४८८.००	९७.६०
१५५	ठाकुर टोल पश्चिम राजाधनपाल थान निर्माण	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१९२.००	९६.००
१५६	ठाकुर टोलको लक्ष्मी मन्दिर निर्माण	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	४६७.००	९३.४०
१५७	धनीपट्टी पश्चिम सिसाबारीमा विश्रामकक्ष निर्माण	प्रतिशत	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१	१००.००	२९४.००	९८.००
१५८	बडाका ६ स्थानमा राजाधनपाल मन्दिर निर्माण सोमबारी चोक अगाडि	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००		०.०००	०.००		०.००
१५९	सुख्खा पोखरी पूर्व राजाधनपाल थान	प्रतिशत	२५०.००	१००.००	०.०००९	२५०.००	१००.००	०.०००९	२५०.००	१००.००	०.००१	१००.००	२३८.००	९५.२०
१६०	संथाल सस्तीमा मजिथान निर्माण	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१६४.००	८२.००
१६१	सन्दरलाल मडलका घर छः राजाधनपाल थान निर्माण	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१९५.००	९७.५०
१६२	इलाका प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण वडा न ६	थान	४०००.००	१.००	०.०१३८	४०००.००	१.००	०.०१३८	४०००.००	१.००	०.०१४	१००.००	१८८०.००	४७.००
१६३	वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा न ६	थान	४३११.००	१.००	०.०१४८	४३११.००	१.००	०.०१४८	४३११.००	०.५०	०.००७	५०.००	३२४९.००	७५.३७
१६४	गया शाहका घर दक्षिण तथा ननकार सडक कालोपत्रे वडा न ६ बेस कोर्स भएको	किमि	५०००.००	०.५८	०.०१७२	५०००.००	०.५८	०.०१७२	५०००.००		०.०००	०.००	४१०१.००	८२.०२
१६५	प्रसादको घरदेखा मुरली घाटसम्म गाभेल वडा न ६	किमि	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००		०.००
१६६	वडा न ६ थानाटालबाट वडा ५ का सन्थाली जाने सडकमा ट्रिपल सेल कलभर्ट वडा न ६	थान	३५००.००	०.५०	०.०१२०	३५००.००	०.५०	०.०१२०	३५००.००	०.३०	०.००७	६०.००	३१९६.००	९१.३१
१६७	सहना टाल पाना निकास तथा बाटा निर्माण वडा न ६	सेट	२५००.००	१.००	०.००८६	२५००.००	१.००	०.००८६	२५००.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	०.००
१६८	खानेपानी टुयुवेल खरिद तथा जडान -६	सेट	२००.००	२६.००	०.०००७	२००.००	२६.००	०.०००७	२००.००	२६.००	०.००१	१००.००	२००.००	१००.००
१६९	गणेश मा वि भवन तथा शौचालय निर्माण -६	थान	१०२९.००	१.००	०.००३५	१०२९.००	१.००	०.००३५	१०२९.००	१.००	०.००४	१००.००	१००३.००	९७.४७
१७०	पब्लिक मा वि अधुरो शौचालय निर्माण -६	थान	१२००.००	१.००	०.००४१	१२००.००	१.००	०.००४१	१२००.००	१.००	०.००४	१००.००	११७५.००	९७.९२
१७१	सरसफाई कार्यक्रम (रिड प्यान वितरण) -६	सेट	९००.००	६४.००	०.००३१	९००.००	६४.००	०.००३१	९००.००	६४.००	०.००३	१००.००	१५१.००	१६.७८
१७२	आर सि सि ड्रेन कम्पनि निर्माण गणेश शाह घर देखि हरी महतो घर गया शाह घर दक्षिण सम्म र गणेश मा.वि.को कम्पाउन्ड वाल निर्माण रंगेली ६।	रमी	१३१६.७५	१६०.००	०.००४५	१३१६.७५	१६०.००	०.००४५	१३१६.७५	१६०.००	०.००५	१००.००		०.००
१७३	ओम शान्ति भवन मधुवनी वडा न ६	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	२००.००	१००.००
१७४	खुल्ला जिम वडा न ६	सेट	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००२	१००.००		०.००
१७५	डागा टाल जान बाटामा खुशिलाल शाहका घर अगाडि कलभर्ट	थान	१०००.००	१.००	०.००३४	१०००.००	१.००	०.००३४	१०००.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	०.००
१७६	महर्षि मेहो स्कुल -६	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	५००.००	१००.००
१७७	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण रंगेली ६	थान	२४५७.६८	१.००	०.००८५	२४५७.६८	१.००	०.००८५	२४५७.६८	१.००	०.००८	१००.००	२४०९.००	९८.०२
१७८	माझा टाल सथाल बस्ती जान घाघा खालामा कलभर्टको डि पि आर रंगेली ५ र ६	थान	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००२	१००.००	४५५.००	९९.००
१७९	हनुमान मन्दिर वडा न ६	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	९९.००	१९.८०
१८०	ओम शान्ति भवन मधुवनी	प्रतिशत	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१	१००.००	२८९.००	९६.३३
१८१	काली मन्दिर चोप्राहा व्यवस्थापन	प्रतिशत	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	०.००	०.०००	०.००		०.००

१८२	द्रौपती शहिद गेट निर्माण	थान	१००.००	१.००	०.०००३	१००.००	१.००	०.०००३	१००.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	
१८३	पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	प्रतिशत	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००		०.०००	०.००	०.००	
१८४	बहरदार टोल धनपालथान मन्दिर	प्रतिशत	४००.००	१००.००	०.००१४	४००.००	१००.००	०.००१४	४००.००	१००.००	०.००१	१००.००	३९१.००	९७.७५
१८५	भगवती मन्दिर डाँगा टोल	प्रतिशत	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००		०.०००	०.००	०.००	
१८६	मधुवनी आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	४९३.००	९८.६०
१८७	मधुवनी पोखरी छटघाट निर्माण	रमी	१०००.००	२२.००	०.००३४	१०००.००	२२.००	०.००३४	१०००.००	२२.००	०.००३	१००.००	४९०.००	४९.००
१८८	मुस्कट्टा काली मन्दिर निर्माण मधुवनी	प्रतिशत	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००	१००.००	९७.००	९७.००
१८९	महर्षि आधारभूत विद्यालय	प्रतिशत	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००	१००.००	१००.००	१००.००
१९०	माझी टोल काली मन्दिर निर्माण	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१९५.००	९७.५०
१९१	राजाधनपाल थान जिमदार टोल	प्रतिशत	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१००.००	३३.३३
१९२	श्री संतमत सतसंग मन्दिर साहुटोल	प्रतिशत	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१	१००.००	२९३.००	९७.६७
१९३	सेलेस मन्दिर निर्माण थानाटोल	प्रतिशत	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	१००.००	०.०००३	१००.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	
१९४	साहुटोलको ग्रामथान मन्दिर	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१६३.००	८१.५०
१९५	हनुमान मन्दिर मधुवनी	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१९०.००	९५.००
१९६	मलङथान सिमसारमा कल्भर्ट निर्माण	थान	६०००.००	१.००	०.०२०७	६०००.००	१.००	०.०२०७	६०००.००	०.८०	०.०१७	८०.००	३०६९.००	५१.१५
१९७	ओम शान्ती भवन वडा न ७	प्रतिशत	१०००.००	१००.००	०.००३४	१०००.००	१००.००	०.००३४	१०००.००	१००.००	०.००३	१००.००	९७९.००	९७.९०
१९८	संतमत सतसंग सामुदायिक भवन वडा न ७	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	४८९.००	९७.८०
१९९	रंगेली अस्पताल पूर्वाधार निर्माण । नगरपालीका प्रशासनिक भवन निर्माण - नपा र समन्वय समिति ।	प्रतिशत	८०६५.००	१००.००	०.०२७८	८०६५.००	१००.००	०.०२७८	८०६५.००		०.०००	०.००	५५७१.००	६९.०८
२००	शिव वहान खरिद	प्रतिशत	१५००.००	१००.००	०.००५२	१५००.००	१००.००	०.००५२	१५००.००	१००.००	०.००५	१००.००	१४६०.००	९७.३३
२०१	CCTV/Surveillance Camera	प्रतिशत	४००.००	१००.००	०.००१४	४००.००	१००.००	०.००१४	४००.००		०.०००	०.००	०.००	
२०२	मेशिनरी तथा औजार	प्रतिशत	२५०.००	१००.००	०.०००९	२५०.००	१००.००	०.०००९	२५०.००	१००.००	०.००१	१००.००	२५०.००	१००.००
२०३	महिला प्राविधिक मेशिनरी टेवा कार्यक्रम सुचना प्रविधि शाखामा कम्प्युटर मेशिनरी तथा औजार खरिद ।	प्रतिशत	११००.००	१००.००	०.००३८	११००.००	१००.००	०.००३८	११००.००	१००.००	०.००४	१००.००	१०८३.००	९८.४५
२०४	तेतरी टाल सडक मलङथान भगवति मन्दिर घाघरी खोला सम्म सडक कालोपत्रे ।	किमि	२८२६.७९	०.३५	०.००९७	२८२६.७९	०.३५	०.००९७	२८२६.७९	०.३२	०.००९	९०.००	२३२१.००	८२.११
२०५	पर्दा कार्पेट र फर्निचर फिक्सर रंगेलि न पा का महत्वपूर्ण स्थानमा सि सि क्यामेरा जडान	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	०.००	
२०६	सि सि क्यामेरा जडान तथा सामग्री	प्रतिशत	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१	१००.००	९२.००	३०.६७
२०७	प्लाष्टिक हयुम पाइप खरिद	रमी	२५००.००	२७६.३५	०.००८६	२५००.००	२७६.३५	०.००८६	२५००.००	२७६.३५	०.००९	१००.००	२५००.००	१००.००
२०८	रंगेली ७ का नया सडकमा कल्भर्ट निर्माण रमश मण्डल घरछेउ	थान	१०००.००	१.००	०.००३४	१०००.००	१.००	०.००३४	१०००.००	०.००	०.०००	०.००	०.००	०.००
२०९	हरी कटुवालको घरदेखी झमेलिको घर सम्म र जगन्नाथको घर सम्म र जगन्नाथको घर देवानन्दको घर सम्म नाली सहित टिक ड्रेन कालो पत्रे अक्सफाल्ड पिच वडा न ७	किमि	११५००.००	०.६४	०.०३९६	११५००.००	०.६४	०.०३९६	११५००.००		०.०००	०.००	४४६१.००	३८.७९
२१०	EBPS-ONLINE घर नक्सा पास	प्रतिशत	१७५.००		०.०००६	१७५.००	०.००	०.०००६	१७५.००		०.०००	०.००	०.००	०.००

२१४	FUEL Management system तेल ब्यवस्थापन प्रणाली	प्रतिशत	७५.००		०.०००३	७५.००	०.००	०.०००३	७५.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
२१५	ओ ३ कन्डक्टर खरिद	प्रतिशत	१००.००	१००.००	०.००३५	१०००.००	१००.००	०.००३५	१०००.००	१००.००	०.००३	१००.००	१०००.००	१००.००	
२१६	डि आइरन खरिद	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	५००.००	१००.००	
२१७	बल्ब खरिद	थान	१०००.००	४७५४.००	०.००३५	१०००.००	४७५४.००	०.००३५	१०००.००	३६५९.००	०.००३	७६.७६	१०००.००	१००.००	
२१८	बिद्युत ज्याला	जना	१०००.००	२२७६.००	०.००३५	१०००.००	२२७६.००	०.००३५	१०००.००	१९२५.००	०.००३	८४.५८	१०००.००	१००.००	
२१९	लुज तार नट बल्टु खरिद	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	५६९.००	९३.८०	
२२०	वडा न १ र २ मा बिधुत पाल सिफिटडका लागी ज्याला	प्रतिशत	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
२२१	वडा न ३ ८ ९ मा बिधुतिय पोल सीफिटड ज्याला	प्रतिशत	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
२२२	वडा न ४ र ७ मा बिधुत पाल सिफिटडका लागी ज्याला बापत	प्रतिशत	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
२२३	वडा न ५ र ६ मा पाल सिफिटडका लागी ज्याला बापत	प्रतिशत	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००		०.००	
२२४	विद्युत पोल खरिद - ८	प्रतिशत	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
२२५	शुक्रबारे आदर्श टोल सडक कालोपत्रे	किमि	१००.००		०.०००३	१००.००	०.००	०.०००३	१००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
२२६	खानेपानी मर्मत सम्भार तथा ब्यवस्थापन रंगेली नया खानपाना आयोजनाका लागी समपुरक	प्रतिशत	३०००.००	१००.००	०.०१०३	३०००.००	१००.००	०.०१०३	३०००.००	१००.००	०.०१०	१००.००	२४२७.००	८०.९०	
२२८	वडा न ४ को खानेपानी ब्यवस्थापन	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	५००.००	१००.००	
२२९	वडा न ६ को खानेपानी ब्यवस्थापन	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	०.००	०.०००	०.००		०.००	
२३०	वडा न ७ को खानेपानी ब्यवस्थापन	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	५००.००	१००.००	
२३१	वडा न ७ बक्राह खाला क्षेत्रमा फलफुल बिरुवा बितरण वडा न ७	प्रतिशत	४००.००	१००.००	०.००१५	४००.००	१००.००	०.००१५	४००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
२३२	कब्रस्थान घेराबेरा रंगेली ७	रमी	१०००.००		०.००३५	१०००.००	०.००	०.००३५	१०००.००		०.०००	०.००		०.००	
२३३	कम्पाउन्ड वाल /टायल निर्माण न.पा.को ।	रमी	१३३७.६७		०.००४६	१३३७.६७	०.००	०.००४६	१३३७.६७		०.०००	०.००		०.००	
२३४	कालो मन्दिर धर्माशाला दक्षिण सुरेश सरका घर दक्षिण पार्क निर्माण	बमी	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००		०.००	
२३५	कोल्ड स्टोर सोधभर्ना	प्रतिशत	६०००.००		०.०२०७	६०००.००	०.००	०.०२०७	६०००.००		०.०००	०.००		०.००	
२३६	इन र ड्रेन कामर निर्माण न.पा. र सोमबारी चाक ।	प्रतिशत	३५८०.९४	१००.००	०.०१२३	३५८०.९४	१००.००	०.०१२३	३५८०.९४	५०.००	०.००६	५०.००	२०१६.००	५६.३०	
२३७	पुर्बाधारजन्य कार्यका लागी समपुरक कोष		२०००.००		०.००६९	२०००.००	०.००	०.००६९	२०००.००		०.०००	०.००		०.००	
२३८	भैपरी पुजिगत		७०००.००		०.०२४१	७०००.००	०.००	०.०२४१	७०००.००		०.०००	०.००		०.००	
२३९	रंगेली ७ तिरुपति आर्यघाट ब्यवस्थापन अनुदान		५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००		०.००	
२४०	रंगेली ७ मा रहेको रंगेली गौशाला लाइ अनुदान	थान	१०००.००	१.००	०.००३५	१०००.००	१.००	०.००३५	१०००.००	१.००	०.००३	१००.००	९७९.००	९७.९०	
२४१	रंगेली न पा भित्रका सथाल जातिका माजथान निर्माण तथा मर्मत	प्रतिशत	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१४३.००	४७.६७	
२४२	रंगेली बसपार्क सटर अगाडी सेड निर्माण	प्रतिशत	१०००.००	१००.००	०.००३५	१०००.००	१००.००	०.००३५	१०००.००	१००.००	०.००३	१००.००	१०००.००	१००.००	
२४३	राम मन्दिर निर्माण वडा नं -७	थान	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००२	१००.००	४८८.००	९७.६०	
२४४	वडा नं ७ को हटिया	प्रतिशत	४००.००	१००.००	०.००१५	४००.००	१००.००	०.००१५	४००.००	१००.००	०.००१	१००.००	२२०.००	५५.००	

२४५	सन्तमन्त सत्सँग सामुदायिक भवन निर्माण ।	प्रतिशत	१०००.००	१००.००	०.००३५	१०००.००	१००.००	०.००३५	१०००.००	१००.००	०.००३	१००.००	९७९.००	९७.९०	
२४६	हनुमान मन्दिर निर्माण न पा अगाडि - ७ रंगेली १२५६७८ र ९ मा सिँचाई गट तथा	प्रतिशत	२६०.००	१००.००	०.०००९	२६०.००	१००.००	०.०००९	२६०.००	०.००	०.०००	०.००		०.००	
२४७	विभिन्न सडकहरूमा कल्भर्टको डि पि आर रजना हटियामा पार्क पाना निकासको लागि कल्भर्ट तथा विभिन्न सडकहरूमा कल्भर्टको साथै विभिन्न सडकहरूको डी पि आर तयार रंगेली ३६७ र ८	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	४९७.००	९९.४०	
२४८		प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	०.५०	०.०००	०.५०	४९५.००	९९.००	
२४९	नपा परिसरमा हरियाली प्रबर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास	प्रतिशत	९०.००	१००.००	०.०००३	९०.००	१००.००	०.०००३	९०.००	६०.००	०.०००	६०.००	२२४६.००	२४९५.५६	
२५०	नगरपालिका अगाडा उत्तर जान सडक आर एम सि मेशिन प्रयोग गरी टिक ड्रेन सहित सडक निर्माण	रमी	३१००.००	१४०.००	०.०१०७	३१००.००	१४०.००	०.०१०७	३१००.००	०.५०	०.०००	०.३६	१६२२.००	५२.३२	
२५१	अधुरो बिष्णु मन्दिर निर्माण	प्रतिशत	१५००.००	१००.००	०.००५२	१५००.००	१००.००	०.००५२	१५००.००	१००.००	०.००५	१००.००	७८२.००	५२.१३	
२५२															
२५३	दर्बेशा चाकका घनपनलथान महाराजथान मन्दिर मर्मत तथा निर्माण वडा न ८	प्रतिशत	८००.००	१००.००	०.००२८	८००.००	१००.००	०.००२८	८००.००	१००.००	०.००३	१००.००	८००.००	१००.००	
२५४	सथाल जातिको सामुदायिक भवन निर्माण वडा न ८	थान	१७८९.००	१.००	०.००६२	१७८९.००	१.००	०.००६२	१७८९.००	१.००	०.००६	१००.००	१७६२.००	९८.४९	
२५५	नारायण साहका घर हुद उत्तर जान सडक कालोपत्रे वडा न ८ ग्रामिणको कार्य भएको	किमि	२०००.००	०.१८	०.००६९	२०००.००	०.१८	०.००६९	२०००.००		०.०००	०.००	२६०.००	१३.००	
२५६	खानेपानि ट्युवेल खरिद - ८	सेट	२००.००	२४.००	०.०००७	२००.००	२४.००	०.०००७	२००.००	२४.००	०.००१	१००.००	१२९.००	६४.५०	
२५७	ढक्कन सहितको पक्की नाली नारायण साहका घर साझा टोल ।	रमी	५९१.९९	०.१८	०.००२०	५९१.९९	०.१८	०.००२०	५९१.९९	०.१६	०.००२	८८.५७	०.००	०.००	
२५८	चन्द्रानन्दको घरदेखा पुर्ब हुद हडाड खाला नाला निर्माण वडा न ८	रमी	२१००.००	०.३०	०.००७२	२१००.००	०.३०	०.००७२	२१००.००	०.३०	०.००७	१००.००	१०३७.००	४९.३८	
२५९	चानो टोल दिनाभद्री मन्दिर निर्माण उ स	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००		०.०००	०.००		०.००	
२६०	छठमाता मन्दिर मर्मत तथा निर्माण वडा न ८	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००		०.००	
२६१	छठी माई मन्दिर निर्माण - ८	प्रतिशत	१२५.००	१००.००	०.०००४	१२५.००	१००.००	०.०००४	१२५.००		०.०००	०.००		०.००	
२६२	झमनपुर धन बहादुर थापाको घर छेउबाट पश्चिम चिसाड खोला सम्म सडक निर्माण - ८	किमि	१४३.००	०.२५	०.०००५	१४३.००	०.२५	०.०००५	१४३.००	०.२३	०.०००	९२.००	८९.००	६२.२४	
२६३	दिनाभद्री मन्दिर निर्माण - ८	प्रतिशत	४३.००	१००.००	०.०००१	४३.००	१००.००	०.०००१	४३.००	१००.००	०.०००	१००.००	४०.००	९३.०२	
२६४	वडा कार्यालयको छतमा ट्रस्ट निर्माण - ८	थान	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००२	१००.००	३७८.००	७५.६०	
२६५	वडा न ८ को खेल मैदान	प्रतिशत	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१०	३००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१००.००	३३.३३	
२६६	इन्द्र ऋषिदेवको घर देखि माहन सरदारका घरसम्म जाने बाटो मर्मत ।	किमि	१५०.००		०.०००५	१५०.००	०.००	०.०००५	१५०.००		०.०००	०.००	१५०.००	१००.००	
२६७	जान बहरदार सरको घर जाने बाटो मर्मत		१५०.००		०.०००५	१५०.००	०.००	०.०००५	१५०.००	०.००	०.०००	०.००		०.००	
२६८	धनलाल गिरीको घर जाने बाटो मर्मत ।		२००.००		०.०००७	२००.००	०.००	०.०००७	२००.००		०.०००	०.००		०.००	
२६९	बाशुदव आचार्यको घर देखि पश्चिम जान बाटो मर्मत ।	किमि	१०००.००	०.२६	०.००३५	१०००.००	०.२६	०.००३५	१०००.००	०.२६	०.००३	१००.००	७३९.००	७३.९०	

२७०	महेन्द्र शाहका घर हुँद इदगाहा बिष्णू पुरी घरसम्म जाने बाटो साझा टोल ।३मी चोडाइ	किमि	२००.००	०.१२	०.०००७	२००.००	०.१२	०.०००७	२००.००	०.१२	०.००१	१००.००	११९.००	५९.५०	
२७१	राम विलास पासमानका घर देखि दिपक मल्लिकको घर सम्म ।		१००.००		०.०००३	१००.००	०.००	०.०००३	१००.००		०.०००	०.००		०.००	
२७२	सुगा बाबका घर देखि पश्चिम जान बाटो निर्माण ।		३००.००		०.००१०	३००.००	०.००	०.००१०	३००.००		०.०००	०.००		०.००	
२७३	चिहान डाडामा गेउरीया खोलामा बक्स कल्भर्ट		१२००.००		०.००४१	१२००.००	०.००	०.००४१	१२००.००		०.०००	०.००		०.००	
२७४	साना सीचाइ आयोजना बडाभरी ।	सेट	१०००.००	२०.००	०.००३४	१०००.००	२०.००	०.००३४	१०००.००	२०.००	०.००३	१००.००	७४५.००	७४.५०	
२७५	दक्षिण टोल बालकेन्द्र घेरा बेरा यम बहादुर पाषाका घर देखि नाहन सरदारका घर सम्म जाने बाटो मर्मत	रमी	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	५००.००	१००.००	
२७६	नारायण राजवंशीको घर छुटका बजरगवली मन्दिर ।	किमि	२००.००	०.१२	०.०००७	२००.००	०.१२	०.०००७	२००.००	०.१२	०.००१	१००.००	२००.००	१००.००	
२७७	श्री महालक्ष्मी मा.वि को प्राङ्गणमा स्टेज निर्माण	प्रतिशत	३५०.००	१००.००	०.००१२	३५०.००	१००.००	०.००१२	३५०.००	१००.००	०.००१	१००.००	३३८.००	९६.५७	
२७८	महालक्ष्मी मा.वि को बाल र वडा कार्यालयको बाल निर्माण कार्य	रमी	४००.००	२७.००	०.००१४	४००.००	२७.००	०.००१४	४००.००	२७.००	०.००१	१००.००	४००.००	१००.००	
२७९	चिहान डाँडा कमनपुर बासु आचार्य देखि जुगादिया बाघ र खडग नारायण वतराही सम्म नहरको बाटो	किमि	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००		०.००	
२८०															
२८१															
२८२	दुर्घटना न्युनिकरणका लागि टवा पर्खाल निर्माण वेदमारी मोड - ९	रमी	५००.००	३५.००	०.००१७	५००.००	३५.००	०.००१७	५००.००	३२.००	०.००२	९१.४३	४७३.००	९४.६०	
२८३	बल चाक दाहमाना सडक खण्डमा ३ मा स्पानको स्लाभ कल्भर्ट वडा न ९	थान	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	१.००	०.००१७	५००.००	०.७०	०.००१	७०.००	१७२.००	३४.४०	
२८४	भागिरथ घर छुट हुँद नहर निस्कने बाटो वडा न ९	किमि	५००.००		०.००१७	५००.००	०.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००	०.००	०.००	
२८५	सखुवाथान बेलचौक पुर्ब दाहमाना मोदराजको गाउ हुँद हरकपुर जोइने सडक तथा तथा धनजुवा भगवान चन्द गाउको सडक वडा न ९	किमि	६२००.००	२.६०	०.०२१३	६२००.००	२.६०	०.०२१३	६२००.००	२.६०	०.०२१	१००.००	४८८३.००	७८.७६	
२८६	सखुवाथान वलचाक पुर्व दाहमाना जान सडकमा कल्भर्ट निर्माण ।	थान	१३२७.३५	४.००	०.००४६	१३२७.३५	४.००	०.००४६	१३२७.३५	४.००	०.००५	१००.००	९५६.००	७२.०२	
२८७	खानेपानी ट्युवेल खरिद - १	सेट	१००.००	१२.००	०.०००३	१००.००	१२.००	०.०००३	१००.००	१२.००	०.०००	१००.००	०.००	०.००	
२८८	ओम पञ्चेश्वर शिव मन्दिर युवा चौक वडा न ९	प्रतिशत	२०००.००	१००.००	०.००६९	२०००.००	१००.००	०.००६९	२०००.००	१००.००	०.००७	१००.००	१९९९.००	९९.९५	
२८९	दाहमानाको बगान टोलमा मजिबाबा थान निर्माण	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	४८७.००	९७.४०	
२९०	पावती मा वि प्लास्टर कार्य रंगेली ९	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	४७८.००	९५.६०	
२९१	युवा चाक स्थित दिनाभद्री मन्दिर मर्मत तथा सम्भार	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.००१	१००.००	१८५.००	९२.५०	
२९२	चमरु यादवका घर दखा विन्देश्वरी यादवका घरसम्म जाने बाटो मर्मत	किमि	५००.००	०.३६	०.००१७	५००.००	०.३६	०.००१७	५००.००	०.३६	०.००२	१००.००	५००.००	१००.००	
२९३	धर्म चन्द राजवंशीका घर देखि अनिता राजवंशीको घर देखि राजवंशीको घरसम्म ग्राभेल ।	किमि	२००.००		०.०००७	२००.००	०.००	०.०००७	२००.००		०.०००	०.००	१८३.००	९१.५०	

२९४	पटवारी टाल देखि छलकुमार राजवंशिको खेतसम्म ग्राभेल	किमि	४००.००	०.२५	०.००१४	४००.००	०.२५	०.००१४	४००.००	०.२५	०.००१	१००.००	३९२.००	९८.००	
२९५	बगान टाल स्थित दिनाभद्री मन्दिर मर्मत तथा सम्भार	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	१००.००	०.०००७	२००.००	०.००	०.०००	०.००		०.००	
२९६	वडा कार्यालयको भवन जान विभिन्न बाटोहरु निर्माण	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	४९२.००	९८.४०	
२९७	सखुवाथान स्थित महाराज थानको घेरा बेरा	रमी	२००.००	२५.००	०.०००७	२००.००	२५.००	०.०००७	२००.००	२५.००	०.००१	१००.००	२००.००	१००.००	
२९८	दयानन्द यादवको घर पछाडि देखि बक्राहा खोला डाँस खोला सम्म तटबन्धन	रमी	५००.००	२००.००	०.००१७	५००.००	२००.००	०.००१७	५००.००		०.०००	०.००		०.००	
२९९	शान्ती टाल देखि धनजुवा सम्मको बाटोको विभिन्न स्थानमा कल्भर्ट निर्माण	थान	५००.००	३.००	०.००१७	५००.००	३.००	०.००१७	५००.००	२.००	०.००१	६६.६७	५००.००	१००.००	
३००	सखुवाथान देखि पुर्व दोहमना जाने बाटो मर्मत	किमि	८००.००	१.५०	०.००२८	८००.००	१.५०	०.००२८	८००.००	१.५०	०.००३	१००.००	८००.००	१००.००	
३०१	सखुवाथान स्थित जगतमान आडदेम्वेको घरसम्म र रविन सुब्बा घर जाने बाटो ग्राभेल	किमि	१०००.००	०.८०	०.००३४	१०००.००	०.८०	०.००३४	१०००.००	०.८०	०.००३	१००.००	९५८.००	९५.८०	
३०२	ह्यूमपाईप जडान धनजुवा र दोहमाना हटिया दक्षिण काय	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००१७	५००.००	१००.००	०.००२	१००.००	५००.००	१००.००	
३०३	हरि भण्डारी घर दक्षिण दोहमाना बजार सम्म मेशिनवाट माटोको काम	किमि	४००.००	०.५०	०.००१४	४००.००	०.५०	०.००१४	४००.००	०.५५	०.००१	९०.००	३९१.००	९७.७५	
३०४	रंगेली ९ रविन सुब्बाको घर देखि उत्तर कानेपोखरी गा.पा. वडा नं.२ दलेली बजार सम्म जाने सडक	किमि	४००.००	०.६०	०.००१४	४००.००	०.६०	०.००१४	४००.००	०.६०	०.००१	१००.००	२८६.००	७१.५०	
३०५	मर्मत सम्भार कोष	किमि	२६४७०.००	११.११	०.०९११	२६४७०.००	११.११	०.०९११	२६४७०.००	१२.९६	०.१०६	१००.००	२४४४३.००	९३.४८	
३०६	विपत व्यवस्थापन बाट ग्यावियन टेवा पर्खाल	रमी	४०६५.००	१७१.००	०.०१४०	४०६५.००	१७१.००	०.०१४०	४०६५.००	१६०.००	०.०१३	९३.५७	३५००.००	८६.१०	
	जम्मा रकम		२५९९९५.४८		१.००	२९०५३०.४८		१.००००	२९०५३०.४८		०.६२९		१७७३२७.००	६१.०४	
८०११३४०४१०५	प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान								०.००						
३०७	कालि मन्दिर सामुदायिक भवन निर्माण	प्रतिशत	५०००.००	१००.००	०.५०	५०००.००	१००.००	०.५०	५०००.००	१००.००	०.५०	१००.००		०.००	
३०८	रंजनि हटिया पार्क निर्माण	प्रतिशत	५०००.००	१००.००	०.५०	५०००.००	१००.००	०.५०	५०००.००	१००.००	०.५०	१००.००		०.००	
					१.००	१००००.००		१.००	१००००.००		१.००		०.००	०.००	
८०११३४०४५०२	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम														
३०९	कोल्ड स्टोर भवन निर्माण	प्रतिशत	३००००.००	१००.००	०.६०	३००००.००	१००.००	०.६०	३००००.००	०.६०	०.००	०.६०	१४४४५.९५	४८.१५	
३१०	रंगेली अस्पतालको भवन निर्माण	प्रतिशत	१००००.००	१००.००	०.२०	१००००.००	१००.००	०.२०	१००००.००	१००.००	०.२०	१००.००	९६१४.३१	९६.१४	
३११	अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन	प्रतिशत	९९४६.००	१००.००	०.२०	९९४६.००	१००.००	०.२०	९९४६.००	७५.००	०.१५	७५.००	७४२६.३३	७४.६७	
	फोहोर व्यवस्थापनको लागि सामानहरु सप्लाई गर्ने कार्य														
	फोहोर व्यवस्थापनको भवन निर्माण गर्ने कार्य														
	जम्मा				१.००	४९९४६.००		१.००	४९९४६.००		०.३५		३१४८६.५९	६३.०४	
८०११३४०४५२१	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम-शसर्त अनुदान														
३१२	बाल बिबाह अन्त्यका लागि किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम	प्रतिशत	१००.००	१००.००	०.०१	१००.००	१००.००	०.०१	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
३१३	चौलेबटौ समाज नेपाल महिला क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	प्रतिशत	१००.००	१००.००	०.०१	१००.००	१००.००	०.०१	१००.००	१००.००	०.०१	१००.००	१००.००	१००.००	

३१४	मैनाबारी टोल हट्टे आर्यघाट जाने सडक-९	किमि	५००.००	०.४७	०.०७	५००.००	०.४७	०.०७	५००.००	०.४५	०.०७	९६.६०	५००.००	१००.००
३१५	लोहन्द्रा खोला विम टोल सामुदायिक वन छेउमा मलामो विश्रामालय निर्माण-१	प्रतिशत	९००.००	१००.००	०.१३	९००.००	१००.००	०.१३	९००.००	१००.००	०.१३	१००.००	८९७.१३	९९.६८
३१६	दर्वेशाचोकमा सार्वजनिक शैचालय निर्माण-८	थान	६००.००	१.००	०.०९	६००.००	१.००	०.०९	६००.००	१.००	०.०९	१००.००	६००.००	१००.००
३१७	निशानेश्वर शिव पंचायतन मन्दिर भौतिक संरचना निर्माण निशानथान भवन हल -३	थान	१०००.००	१.००	०.१५	१०००.००	१.००	०.१५	१०००.००	१.००	०.१५	१००.००	१०००.००	१००.००
३१८	हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक सेवा समाज भवन निर्माण लाटा मोरङ-२	थान	५००.००	१.००	०.०७	५००.००	१.००	०.०७	५००.००	१.००	०.०७	१००.००	५००.००	१००.००
३१९	दालतपुर दिनाभद्री मन्दिरहरु निर्माण-२	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.०७	५००.००	१००.००	०.०७	५००.००	१००.००	०.०७	१००.००	५००.००	१००.००
३२०	तिरुपती बालाजी मन्दिर भौतिक पूर्वाधार निर्माण-७	प्रतिशत	२०००.००	१००.००	०.३०	२०००.००	१००.००	०.३०	२०००.००	१००.००	०.३०	१००.००	१८९६.४२	९४.८२
३२१	नागेश्वर शिव मन्दिर निर्माण-८	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.०७	५००.००	१००.००	०.०७	५००.००	१००.००	०.०७	१००.००	४२७.५१	८५.५०
	जम्मा				१.००	६७००.००		१.००	६७००.००		०.९८		६४२१.०६	९५.८४
८०११३४०४५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)														
३२२	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :-प्रदेश नं. १ को मोरङ जिल्ला क्षेत्र नं. ५ अन्तर्गत रंगेली न.पा. वडा नं. ४ ५ ६ ७ मा- २७७ मध्ये वडा नं ५ को २५ र ६२ वडा ६ को ६१ र वडा ७ को ५४	सेट	६३७६.००	२७७.००	०.०५	६३७६.००	२७७.००	०.०५	६३७६.००	२०२.००	०.०४	७२.९२	६३७५.३२	९९.९९
३२३	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :-प्रदेश नं. १ को मोरङ जिल्ला क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत रंगेली न.पा. वडा नं. १ २ ३ ८ ९ मा- २७९ वटा मध्ये ९ को २५ मात्र	सेट	६२२४.००	२७१.००	०.०५	६२२४.००	२७१.००	०.०५	६२२४.००	२५.००	०.००	९.२३	६२२४.००	१००.००
३२४	VER %26 SP MIS सञ्चालनार्थ वडा कार्यालयहरुको लागि डेक्सटप कम्प्युटर मल्टी फङ्गसनल प्रिन्टर राउटर/कनेक्टीभिटीको लागि उपकरण खरिद	प्रतिशत	१२००.००	१००.००	०.०१	१२००.००	१००.००	०.०१	१२००.००	१००.००	०.०१	१००.००	१२००.००	१००.००
३२५	ट्याब्लेट खरिद	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००	५००.००	१००.००	०.००	५००.००	१००.००	०.००	१००.००	४९९.९९	१००.००
३२६	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण (कम्प्युटर फर्निचर फिक्चर्स क्यामरा अन्य विद्युतीय उपकरण)	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.००	२००.००	१००.००	०.००	२००.००	१००.००	०.००	१००.००	२००.००	१००.००
३२७	नवाकरणार्थ ऊर्जा प्रवधि जडान (वायोग्यास/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य ऊर्जा)	सेट	८००.००	३७.००	०.०१	८००.००	३७.००	०.०१	८००.००	३७.००	०.०१	१००.००	७८९.८३	९८.७३
३२८	कोचेनिचेकारंगेली नगरपालिका	प्रतिशत	१७००.००	१००.००	०.०१	१७००.००	१००.००	०.०१	१७००.००	१००.००	०.०१	१००.००	१७००.००	१००.००
३२९	न पा ६ मलङ्गबाबा सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा सम्वर्द्धन	थान	३०००.००	१.००	०.०३	३०००.००	१.००	०.०३	३०००.००	०.५०	०.०१	५०.००	२९८०.२१	९९.३४
३३०	केन्द्रबाट छनाट भएका नमुना विद्यालयविशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोनन्ति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान	प्रतिशत	६५००.००	१००.००	०.०५	६५००.००	१००.००	०.०५	६५००.००	१००.००	०.०५	१००.००	६२९१.२९	९६.७९
३३१	केन्द्रबाट छनाट भएका नमुना विद्यालयविशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोनन्ति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान	प्रतिशत	५००.००	१००.००	०.००	५००.००	१००.००	०.००	५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

३३२	काली मंदिर सामुदायिक भवन निर्माणरंगेली नगरपालिका वडा नं.७	प्रतिशत	३०००.००	१००.००	०.०३	३०००.००	१००.००	०.०३	३०००.००	१००.००	०.०३	१००.००	३०००.००	१००.००	
३३३	स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सुटढीकरण कार्यक्रम	प्रतिशत	२००.००	१००.००	०.००	२००.००	१००.००	०.००	२००.००	१००.००	०.००	१००.००	२००.००	१००.००	
३३४	सामूहिक आवस कार्यक्रमरंगेली नगरपालिका १ देखी ९ वटै वडामा	सेट	४०००.००	६.००	०.०३	४०००.००	६.००	०.०३	४०००.००	६.००	०.०३	१००.००	४०००.००	१००.००	
३३५	डिपिआर अनुसार कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा निरन्तरता	प्रतिशत	४००००.००	१००.००	०.३४	४००००.००	१००.००	०.३४	४००००.००	१००.००	०.३४	१००.००	३९५७९.४२	९८.९५	
३३६	रंगेली अस्पतालको पूर्वाधार भवन निर्माण-७ थो स्टोर भवन	सेट	३००००.००	१.००	०.२५	३००००.००	१.००	०.२५	३००००.००	०.६०	०.१५	६०.००	२९९९९.५५	१००.००	
३३७	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण मधुवनी-६	सेट	१५२५.००	१.००	०.०१	१५२५.००	१.००	०.०१	१५२५.००	१.००	०.०१	१००.००	९१३.७३	५९.९२	
३३८	आईसियू/पिआईसियू/एच डि यू/भेन्टिलेटर/अक्सिजन/प्लान्ट खरिद तथा जडान	प्रतिशत	१२४३०.००	१००.००	०.१०	१२४३०.००	१००.००	०.१०	१२४३०.००	१००.००	०.१०	१००.००	१२४३०.००	१००.००	
३३९	खेलकूद पूर्वाधार निर्माण-७	प्रतिशत	८००.००	१००.००	०.०१	८००.००	१००.००	०.०१	८००.००	१००.००	०.०१	१००.००	८००.००	१००.००	
	जम्मा				१.००	११८९५५.००		१.००	११८९५५.००		०.८२		११७१८३.३४	९८.५१	

नेपाल सरकार

रंगेली नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रंगेली मोरङ

आ ब ०७८/०७९ को बाषिक लक्ष्य प्रगति विवरण

सि नं	विवरण	इकाई	लक्ष्य	प्रगति	कैफियत
१	सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य (तेतरी टोल ७)	किमी	०.३१५	०.३१५	
२	कचची सडक निर्माण कार्य (हरि भण्डारी ९	किमी	०.४५	०.४५	
३	कचची सडकको चौडाई विस्तार कार्य २,३,८	किमी	८.	८.	
४	कम्पाक्सन सहित ग्राभेल गर्ने कार्य	किमी	३२.०४	३२.०४	
५	३ स्पानको आर सी सी कल्भर्ट निर्माण	थान	१.	क्रमागत	
६	२ स्पानको आर सी सी कल्भर्ट निर्माण	थान	२.	१.	
७	सिंगल स्पानको आर सी सी कल्भर्ट निर्माण	थान	८.	२.	
८	सिंगल स्पानको ब्रिक मेसेनारी कल्भर्ट निर्माण	थान	३.	क्रमागत	
९	आधारभूत स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्य	थान	१.	१.	
१०	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य	थान	१.	१.	
११	नमुना भवन निर्माण पब्लिक स्कुल रंगेली ६ ए ब्लक १२ कोठे भवन	थान	१.	१.	
१२	रंगेली अस्पतालको तिन तल्ले बिमारी वाई भवन	थान	१.	क्रमागत	
१३	रंगेली अस्पतालको इमर्जेन्सी भवन	थान	१.	१.	
१४	सामूहिक आवास भवन	थान	६.	६.	
१५	फोहोर ब्यबस्थापन भवन निर्माण कार्य	थान	१.	क्रमागत	
१६	फोहोर ब्यबस्थापनको लागि सामग्री खरिद	थान	८.	८.	
१७	नागरिक आवास कार्यक्रम	घर स	५४८.	२२७.	

१८	कृषि थोक बजार निर्माण कार्य	प्रतिशत	१००.	क्रमागत	
१९	कोल्ड स्टोर भवन निर्माण कार्य	थान	१.	क्रमागत	
२०	सिंचाई गेट निर्माण	सेट	७.	४.	
२१	प्लम कंक्रीटको रिटेनिंग वाल निर्माण	रमी	८७०.	८२५.	
२२	मन्दिर/स्कूल /भवनको घेरबेरा	रमी	३७५.	३७३.२	
२३	पक्क नाली निर्माण	रमी	११२०.	११२०.	
२४	नगरपालिका कार्यालय भित्र हरियाली पार्क निर्माण	सेट	१.	०.८५	
२५	बिर्ता बजार चोकमा हटियाको लागि पार्क	सेट	१.	१.	
२६	आमगाछीको सोमबारे चोकमा हटियाको लागि	प्रतिशत	१.	१.	
२७	प्लास्टिक हुमपाइप खरिद कार्य	रमी	१७६.३५	१७६.३५	
२८	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	थान	२.	२.	क्रमागत
२९	ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण कार्य	थान	२.	२.	क्रमागत
३०	सडक बती खरिद गरि जडान गर्ने कार्य	थान	४७५४.	३६४९.	
३१	ग्याबियान टेवा पर्खाल	रमी	१२४.	१२४.	
३२	बोरिंग खरिद गर्ने कार्य	सेट	४४.	४४.	
३३	ट्युबवेल खरिद गर्ने कार्य	सेट	२८२.	२४०.	

319

286

7426.3300

-5533624

5540000

248	4960000	1890000	6850000
-----	---------	---------	---------

25	1250000		1250000
----	---------	--	---------

273	6210000		8100000
	6203624.00		
